



# КОМПЛЕКСНЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ

## для инвесторов, заказчиков и ЕРС/ЕРСМ-компаний

[www.ControlSystems.ru](http://www.ControlSystems.ru)  
[www.ERCM.ru](http://www.ERCM.ru)

Евгений Гламаздин  
компания «Системы управления»



Компания «Системы управления» - ведущий центр компетенции по управлению инвестиционными программами и проектами

Основные виды услуг компании:

- Комплексный управленческий консалтинг по управлению проектами
- Внедрение специализированных IT-решений по управлению проектами капитального строительства



Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства



Управление проектированием промышленных объектов



Интеграция системы управления проектами с управленческим и бухгалтерским учетом



Интеграция системы управления проектами с системами электронного документооборота



Интеграционные решения:  
SAP – PRIMAVERA, SAP – Сметное ПО

Компания «Системы управления» предлагает комплексные IT-решения для ключевых участников инвестиционного процесса: заказчиков, генеральных подрядчиков, поставщиков оборудования, проектных организаций, ремонтных и сервисных предприятий.


Опыт внедрения систем управления проектами капстроительства:  
(Заказчики и пользователи специализированных IT-решений)

- Строительство
- Трубопроводный транспорт
- Нефтегазовое строительство
- Цветная металлургия
- Горно-добывающая промышленность
- Черная металлургия
- Энергетика
- Транспортное строительство

# Схема функционирования системы управления проектами



# Планирование строительства

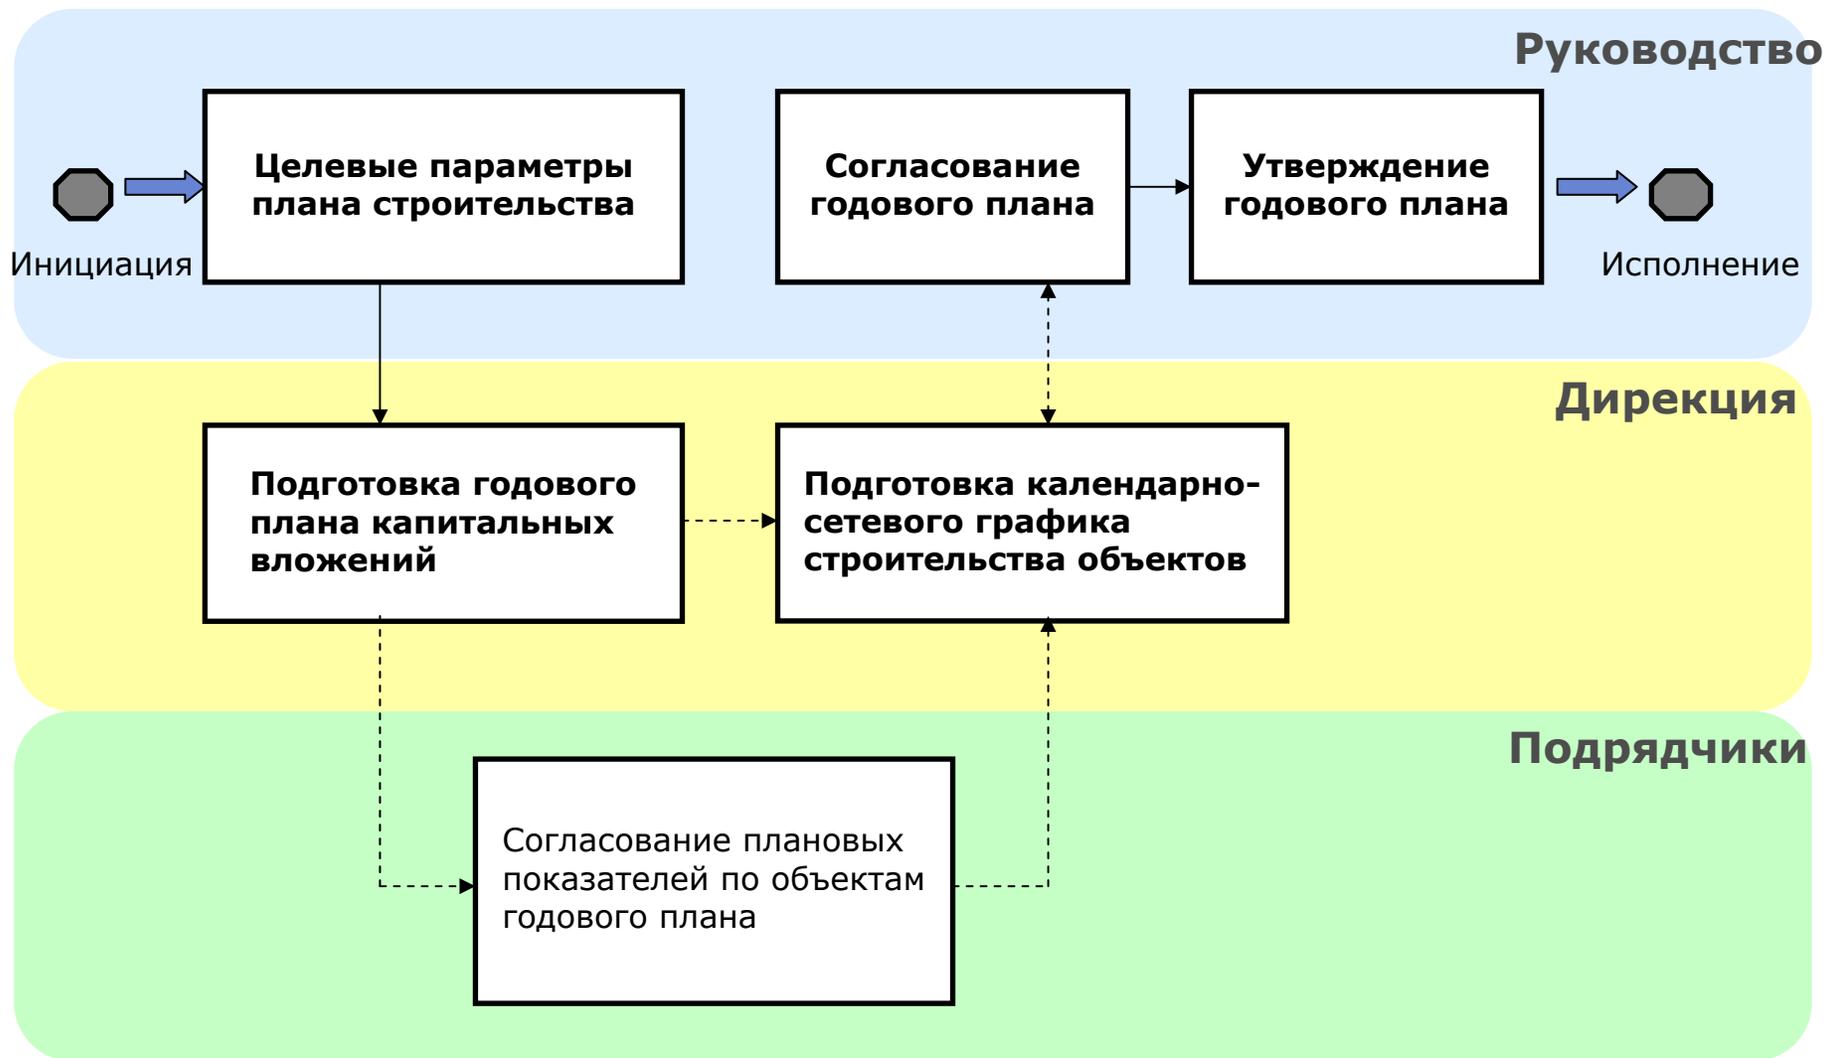

Проекты

- Проекты
- Ресурсы
- Отчеты
- Контроль
- WBS
- Работы
- Assignments
- Документы
- Расходы
- Показатели
- Извещения
- Риски



▼ Макет: Основной макет

ID проекта	Название проекта	Исходный бюджет	Планируемый старт	Навязанный финиш
М №1	Микрорайон №1		29.06.04	
ЖС	Жилищное строительство		29.06.04	
1234.3.04.01	Жилой комплекс №1	15.600,00	01.01.04	31.12.06
1234.3.04.02	Жилой комплекс №2	44.040,00	01.01.04	31.12.05
1234.3.04.05	Жилой комплекс №5	58.720,00	01.01.04	31.12.06
Инфр	Объекты инфраструктуры		29.06.04	
12.011.2.013	Сервисный автоцентр	48.495,00	01.01.04	31.12.06
1234.3.03.02	Спортивно-оздоровительный центр	69.453,00	01.01.04	31.12.06
ТоргЦН#1	Торгово-развлекательный центр	13.154,00	01.01.04	31.12.06
Соц	Объекты социальной сферы		29.06.04	
ДСН#1	Детский сад №1	35.780,00	01.01.04	31.12.06
ДСН#2	Детский сад №2	92.569,00	01.01.04	31.12.06
П-ка#1	Поликлиника №1	75.230,00	01.01.04	31.12.06
П-ка#2	Поликлиника №2	03.670,00	01.01.04	31.12.06

- Открыть проект Ctrl+O
- ✓ Форма проекта
- Суммировать проект...
- Удалить итоги по проекту
- ✂ Вырезать Ctrl+X
- 📄 Копировать Ctrl+C
- 📄 Вставить Ctrl+V
- ⬇ Заполнить вниз
- 📄 Новый Ins
- ✂ Удалить Del
- 📄 Колонки
- 📄 Шрифт и цвета таблицы...
- 🔍 Фильтр
- 📄 Группировка и сортировка
- ➕ Развернуть все Ctrl+Num +
- ➖ Свернуть все Ctrl+Num -
- Untranslated ID : 4317

- 📄 Новый
- ✂ Удалить
- ✂ Вырезать
- 📄 Копировать
- 📄 Вставить

Общие | Даты | Заметки | Журнал бюджета | План финансирования | Итоги

По умолчанию | Ресурсы

Приоритет выравнивания: 10

Запуск...

# Структура декомпозиции работ

- Проекты
- Ресурсы
- Отчеты
- Контроль
- WBS
- Работы
- Назначения
- Документы
- Расходы
- Показатели
- Извещения
- Риски

- Новый
- Удалить
- Вырезать
- Копировать
- Вставить

Код WBS	Название WBS
1234.3.04.01	Жилой комплекс № 1
1234.3.04.01.1	Подготовка территории строительства
1234.3.04.01.1.1	Снос строений, разборка пр, отвод участка
1234.3.04.01.1.2	Геодезия
1234.3.04.01.1.3	Перекладка инженерных сетей из пятна застройки
1234.3.04.01.1.4	Очистка территории от деревьев и кустарников
1234.3.04.01.1.5	Прочее
1234.3.04.01.2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)
1234.3.04.01.2.1	Ограждения строительной площадки и пешеходных зон
1234.3.04.01.2.2	Дороги
1234.3.04.01.2.3	Склады
1234.3.04.01.2.4	Бытовой городок
1234.3.04.01.2.5	Инженерные сети
1234.3.04.01.2.5.4	Электроснабжения
1234.3.04.01.2.6	БСУ
1234.3.04.01.2.7	Приобъектные цеха
1234.3.04.01.2.8	Прочее
1234.3.04.01.3	Основные объекты строительства
1234.3.04.01.3.1	Земляные работы
1234.3.04.01.3.3	Фундаменты
1234.3.04.01.3.4	Подземная часть
1234.3.04.01.3.4.3	Входы
1234.3.04.01.3.4.4	Перегородки
1234.3.04.01.3.5	Надземная часть
1234.3.04.01.3.5.1	Внутренний каркас

← WBS проекта

- Общие
- Заметки
- Журнал бюджета
- План финансирования
- Итог по бюджету
- Вехи WBS
- Документы
- Освоенный объем


# Работы



▼ Макет: Ввод плановых данных

Фильтр: Все работы

ID работы	Название работы
<b>Жилой комплекс: № 1</b>	
<b>Подготовка территории строительства</b>	
SMP1110	Вырубка деревьев
SMP1120	Вертикальная планировка
SMP1130	Устройство ограждения
Снос строений, разборка пр, отвод участка	
Геодезия	
Перекладка инженерных сетей из пятна застройки	
Очистка территории от деревьев и кустарников	
Прочее	
<b>Основные объекты строительства</b>	
Земляные работы	
SMP1160	Уст-во котлована
Фундаменты	
SMP 1170	Устр-во основания и монолитной плиты
Подземная часть	
SMP2080	Монтаж цокольного этажа
Входы	
SMP2090	Устр-во входов
Перегородки	
Надземная часть	
Внутренний каркас	
SMP2390	Монтаж 1-го этажа

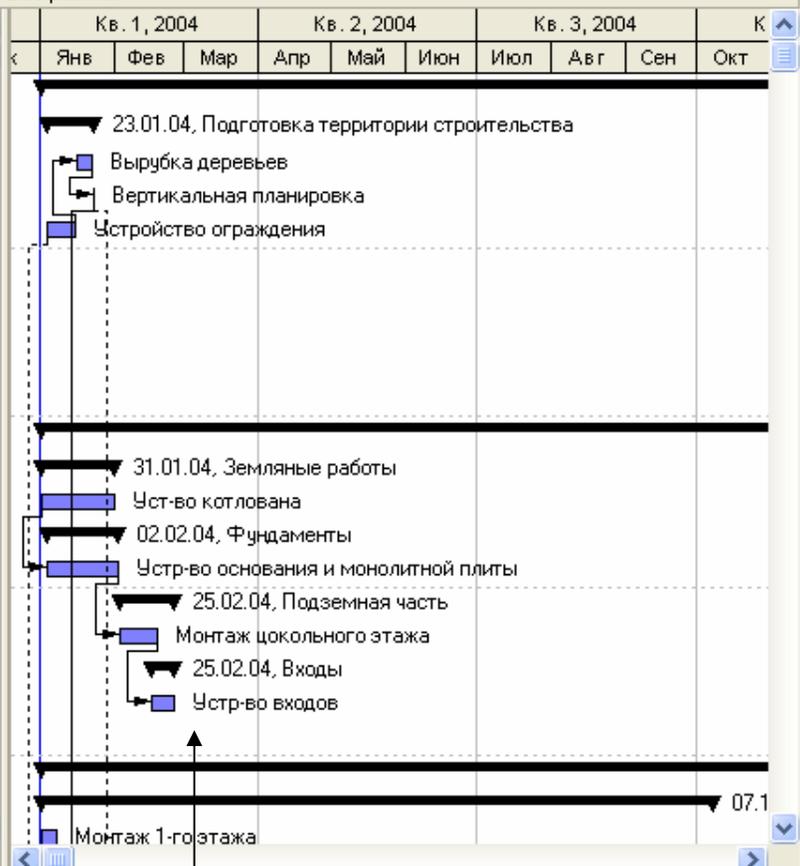

Новый

Удалить

Вырезать

Копировать

Вставить

Ресурсы

Рес. по роли

Роли

Коды работ

Предшествен...

Последователи

Общее	Статус	Ресурсы	Коды	Заметки	Шаги	Документы	Расходы	Последователи	Предшественники	Зависимости
Работа										Проект
Статья затрат										

**Календарно-сетевой график**

# Работы



▼ Макет: Ввод плановых данных      Фильтр: Все работы

ID работы	Название работы	Кв. 1, 2004		Кв. 2, 2004		Кв. 3, 2004		K		
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн		Июл	Авг
<b>Жилой комплекс № 1</b>										
<b>Подготовка территории строительства</b>										
SMP1110	Вырубка деревьев									
SMP1120	Вертикальная планировка									
SMP1130	Устройство ограждения									
Снос строений, разборка пр, отвод участка										
Геодезия										
Перекладка инженерных сетей из пятна застройки										
Очистка территории от деревьев и кустарников										
Прочее										
<b>Основные объекты строительства</b>										
<b>Земляные работы</b>										
SMP1160	Уст-во котлована	23.01.04, Подготовка территории строительства								
Уст-во котлована										
31.01.04, Земляные работы										
Уст-во котлована										
<b>Фундаменты</b>										
SMP 1170	Устр-во основания и монолитной плиты	02.02.04, Фундаменты								
Устр-во основания и монолитной плиты										
<b>Подземная часть</b>										
SMP2080	Монтаж цокольного этажа	25.02.04, Подземная часть								
Монтаж цокольного этажа										
<b>Входы</b>										
SMP2090	Устр-во входов	25.02.04, Входы								
Устр-во входов										
Перегородки										
<b>Надземная часть</b>										
<b>Внутренний каркас</b>										
SMP2390	Монтаж 1-го этажа	07.1								
Монтаж 1-го этажа										

- Новый
- Удалить
- Вырезать
- Копировать
- Вставить
- Ресурсы
- Рес. по роли
- Роли
- Коды работ
- Предшествен...
- Последователи

Общие    Статус    Ресурсы    Коды    Заметки    Шаги    Документы    Расходы    Последователи    Предшественники    Зависимости

Работа: SMP1160    Уст-во котлована    Проект: 1234.3.04.01

Статья затрат	План. ст-ть
SMP	629.010,00

**Статьи затрат (по структуре КВЛ)**


# Работы




▼ Макет: Ввод плановых данных

Фильтр: Все работы

ID работы	Название работы
<b>Жилой комплекс: № 1</b>	
<b>Подготовка территории строительства</b>	
SMP1110	Вырубка деревьев
SMP1120	Вертикальная планировка
SMP1130	Устройство ограждения
Снос строений, разборка пр, отвод участка	
Геодезия	
Перекладка инженерных сетей из пятна застройки	
Очистка территории от деревьев и кустарников	
Прочее	
<b>Основные объекты строительства</b>	
Земляные работы	
SMP1160	Уст-во котлована
Фундаменты	
SMP 1170	Устр-во основания и монолитной плиты
Подземная часть	

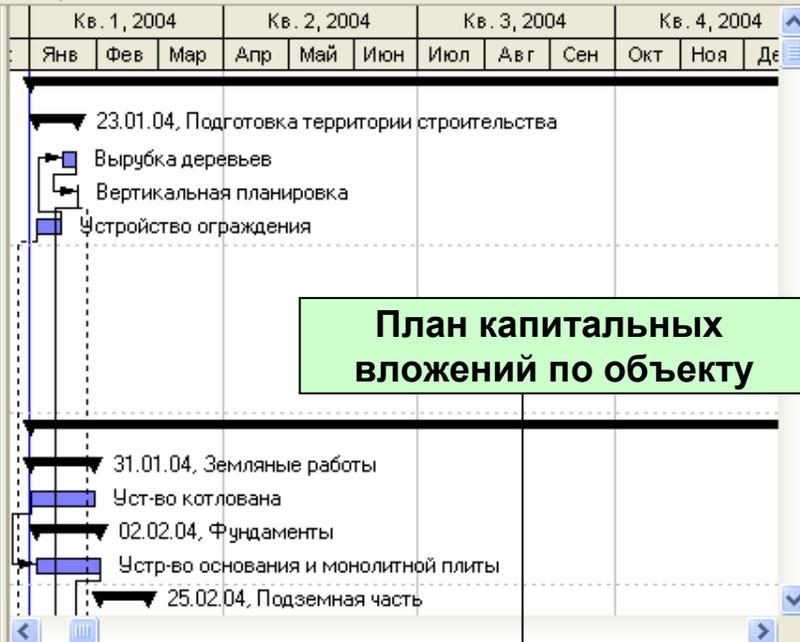

**План капитальных вложений по объекту**

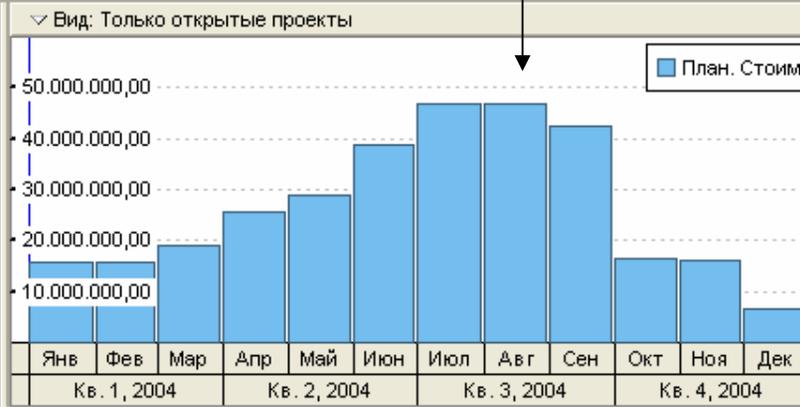

- Новый
- Удалить
- Вырезать
- Копировать
- Вставить
- Ресурсы
- Рес. по роли
- Роли
- Коды работ
- Предшествен...
- Последователи

Показать загрузку для

Все работы  Выбранные работы

Показать работы для выбранного...

Интервал времени



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Годовой план

Показатели объекта

Объект строительства


Наименование: Жилой комплекс №1 ID Объекта: 1234.3.04.01  
 Местонахождение: Микрорайон №1 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Проектировщик: Гипростройпроект Генподрядчик: Промспецстрой  
 Сроки строительства: Начало: 01.01.2004 Конец: 31.12.2006

- План капитальных вложений | Годовой план | Финансирование | Договорное обеспечение | Дополнительно | Контроль


Наименование показателя	План КВ 2004	План капитальных вложений 2004 г.						
		1 квартал	Январь	Февраль	Март	2 квартал	Апрель	Май
Мощность (м2)								
Основные фонды	78 849 200,00р.							
Капитальные вложения	318 864 748,72р.	50 434 458,00р.	15 871 488,27р.	9 944 791,11р.	9 357 425,58р.	6 666 611,07р.	16 070 771,18р.	28 726 538,00р.
СМР	200 884 791,69р.	31 773 708,54р.	9 871 488,27р.	9 944 791,11р.	9 357 425,58р.	6 666 611,07р.	16 070 771,18р.	18 037 724,00р.
Обор-е	79 716 187,18р.	12 608 614,50р.	3 917 257,25р.	3 946 340,00р.	4 745 010,00р.	23 280 400,00р.	6 377 290,00р.	7 181 639,70р.
Прочие	38 263 769,85р.	6 052 134,96р.	1 880 283,48р.	1 894 240,00р.	2 277 600,00р.	11 174 600,00р.	3 061 100,00р.	3 447 184,00р.

План капитальных вложений по объекту

Сметные лимиты текущего года

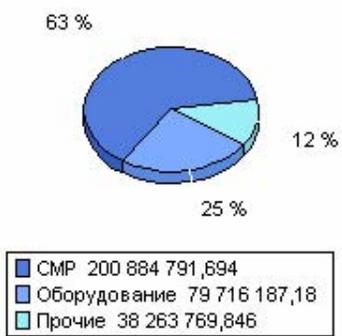

План капитальных вложений 2004

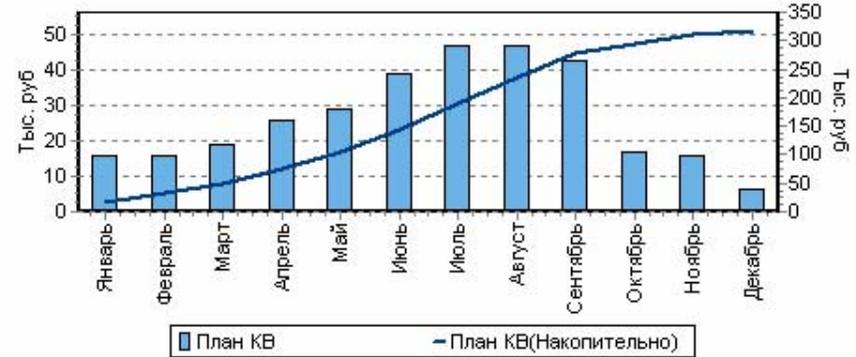



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

**Годовой план**

**План капитальных вложений**


Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
<b>Местонахождение объекта : Микрорайон №1</b>						
<b>Тип объекта : 1.Жилищное строительство</b>						
Жилой комплекс № 1	1 142,72	318,86	15,67	15,79	18,98	50,43
Жилой комплекс № 2	1 028,44	286,98	14,10	14,21	17,08	45,39
Жилой комплекс № 5	1 371,26	382,64	18,80	18,94	22,78	60,52
<b>Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры</b>						
Сервисный автоцентр	342,81	95,66	4,70	4,74	5,69	15,13
Спортивно-оздоровительный центр	314,25	87,69	4,31	4,34	5,22	13,87
Торгово-развлекательный центр №1	799,90	223,21	10,97	11,05	13,29	35,30
<b>Тип объекта : 3.Объекты социальной сферы</b>						
Детский сад №1	57,14	15,94	0,78	0,79	0,95	2,52
Детский сад №2	59,99	16,74	0,82	0,83	1,00	2,65
Поликлиника №1	199,98	55,80	2,74	2,76	3,32	8,83

(Всего больше 0,00)

**Объекты строительства (EPS)**


План капитальных вложений 2004    План финансирования 2004

Структура годового плана



- 1.Жилищное строительство 988,481
- 2.Объекты инфраструктуры 406,553
- 3.Объекты социальной сферы 145,881
- 4.Дорожное строительство 40,655
- 5.Инженерные объекты 83,702

План капитальных вложений 2004

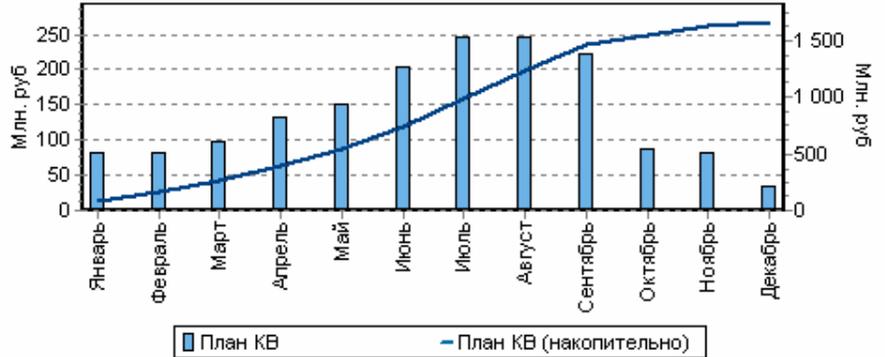

# Договорное обеспечение

Годовой план





- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

**План строительства**


**Годовой план**

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Тип объекта : 1.Жилищное строительство						
Жилой комплекс № 1	1 142,72	318,86	15,67	15,79	18,98	50,43
Жилой комплекс № 2	1 028,44	286,98	14,10	14,21	17,08	45,39
Жилой комплекс № 5	1 371,26	382,64	18,80	18,94	22,78	60,52
Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры						
Спортивно-оздоровительный центр	314,25	87,69	4,31	4,34	5,22	13,87
Строительство сервисного автоцентра	342,81	95,66	4,70	4,74	5,69	15,13
Торгово-развлекательный центр №1	799,90	223,21	10,97	11,05	13,29	35,30
Тип объекта : 3.Объекты социальной сферы						
Детский сад №1	57,14	15,94	0,78	0,79	0,95	2,52
Детский сад №2	59,99	16,74	0,82	0,83	1,00	2,65

(Всего больше 0) Выбор...


План капитальных вложений 2004    План финансирования 2004

Структура годового плана



- 1.Жилищное строительство 988,481
- 2.Объекты инфраструктуры 406,553
- 3.Объекты социальной сферы 145,881
- 4.Дорожное строительство 40,655
- 5.Инженерные объекты 83,702

План капитальных вложений 2004

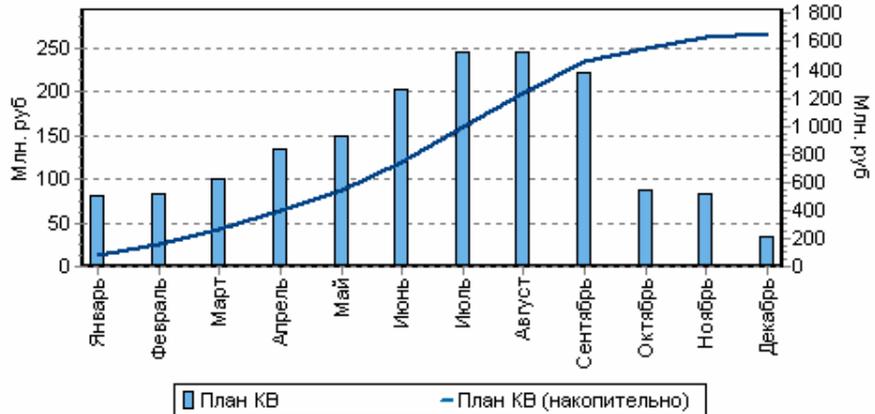



Титульные списки

Договорное обеспечение

Проектирование

Производство

Учет и контроль

**Типы договоров**

Аналитика и отчетность

Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Тип объекта : 1.Жилищное строительство						
Жилой комплекс № 1	1 142,72	318,86	15,67	15,79	18,98	50,43
Жилой комплекс № 2	1 028,44	286,98	14,10	14,21	17,08	45,39
Жилой комплекс № 5	1 371,26	382,64	18,80	18,94	22,78	60,52
		87,69	4,31	4,34	5,22	13,87

**Реестр договоров по объекту строительства:**

**Объекты**

Наименование: Жилой комплекс № 1      ID Объекта: 1234.3.04.01      Сроки строительства: Начало 01.01.2004, Конец 31.12.2006

Местонахождение: Микрорайон №1      Тип объекта: 1.Жилищное строительство

Проектировщик: Гипростройпроект      Генподрядчик: Промспецстрой

План капитальных вложений    Годовой план    Финансирование    **Договорное обеспечение**    Дополнительно    Контроль

Тип договора	Исполнитель	№ договора	Дата подписания	Сумма договора	Статус договора
Договор поставки	Монтажстройснаб	35-27/16 от 14.01.2004	14.01.2004	0,00р.	Договор подписан
Договор поставки	Спецснабтехкомлект	26/12-08 от 12.01.2004	12.01.2004	0,00р.	Договор подписан
Договор подряда	Промспецстрой	12/65-09	01.01.2004	83 955 600,00р.	Договор подписан
Договор ПИР	Гипростройпроект	12/23-34	01.03.2004	1 451 160,00р.	Договор подписан
Договор авторского надзора	Гипростройпроект	10/41-15	01.03.2004	250 300,00р.	Договор подписан

Обновить план       ОК       Отмена

Закрывать

**Исполнители:**

- поставщики
- проектировщики
- подрядчики
- прочие организации



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

- Аналитика и отчетность
- Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.

- Местонахождение объекта : Микрорайон №1
- Тип объекта : Жилой компл
- Тип объекта : Спортивно-оз
- Тип объекта : Детский сад
- Тип объекта : Детский сад
- Тип объекта : Поликлиника
- (Итого I кв.)

**Договор подряда на СМР( Приобретение )**


Тип договора	№ документа	Дата подписания договора
Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004
Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя
Промспецстрой	1589429089	банк
Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика
Субъект 1	1223785401	Банк

Этапы договора

№	Наименование	Дата начал	Дата оконч	Сумма
1	Подготовка территории строительства	04.01.2004	23.01.2004	15 669 029,40р.
2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)	06.01.2004	20.02.2004	0,00р.
3	Основные объекты строительства	01.01.2004	22.12.2004	210 959 113,00р.
4	Объекты энергетического хозяйства	03.07.2004	28.07.2004	46 891 874,80р.
5	Объекты транспортного хозяйства и связи	25.06.2004	27.06.2004	38 885 945,00р.
6	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, т	03.12.2004	14.12.2004	6 458 786,40р.
7	Благоустройство и озеленение	15.06.2004	10.08.2004	0,00р.
				1 142 775 599,60

**Основные этапы договора**

**Сроки и стоимость этапов**





- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Тип объекта : <b>Договор подряда на СМР( Приобретение )</b>						
Жилой компл						50,43
Жилой компл						45,39
Жилой компл						60,52
Тип объекта : Исполнитель						
Спортивно-оз	Промспецстрой	ИНН исполнителя	1589429089	Банк исполнителя	банк	13,87
Тип объекта : Заказчик						
Строительство	Субъект 1	ИНН заказчика		Банк заказчика		15,13
Торгово-разв.						35,30
Тип объекта :						
Детский сад						2,52
Детский сад						2,65
Поликлиника						8,83
<b>(Итого I кв.)</b>						
						59,3

**Договор подряда на СМР( Приобретение )**

Тип договора	№ документа	Дата подписания договора
Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004
Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя
Промспецстрой	1589429089	банк
Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика
Субъект 1		

**Структура декомпозиции работ**

Работы

- 0-Строительно-монтажные работы. Жилой комплекс №1.
  - 1-Подготовка территории строительства
    - 1-Снос строений, разборка пр. отвод участка
    - 2-Геодезия
    - 3-Перекадка инженерных сетей из пятна застройки
    - 4-Очистка территории от деревьев и кустарников
    - 5-Прочее
  - 2-Временные здания и сооружения (подготовительный период)
    - 1-Ограждения строительной площадки и пешеходных зон
    - 2-Дороги
    - 3-Склады
    - 4-Бытовой городок
    - 5-Инженерные сети
      - 4-Электроснабжения
    - 6-БСУ
    - 7-Приобъектные цеха
    - 8-Прочее
  - 3-Основные объекты строительства
    - 1-Земляные работы

WBS проекта

Выбор этапов договора из структуры декомпозиции работ проекта (WBS)



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

### Годовой план

Календарный план

Стоимость объекта

		План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Договор подряда на СМР( Приобретение )		50,43				
Жилой компл		45,39				
Жилой компл		60,52				
Жилой компл						
Исполнитель						
Промспецстрой		13,87				
ИНН исполнителя						
1589429089						
Банк исполнителя						
банк						
Заказчик		15,13				
ИНН заказчика						
Субъект 1		35,30				
1223785401						
Банк заказчика						
Банк						
Этапы договора		2,52				
Дополнительные работы		2,65				
Итого I кв.		8,83				

#### Календарный план этапа

№	Наименование WBS	Старт	Финиш
1	Земляные работы	01.01.2004	31.01.2004
2	Устр-во котлована	01.01.2004	31.01.2004
3	Электромонтажные работы	01.01.2004	25.08.2004
	Сети	01.01.2004	25.08.2004
4	Монтаж электросетей	01.01.2004	25.08.2004
5	Оборудование	01.02.2004	29.04.2004
	Монтаж и наладка оборудования	01.02.2004	29.04.2004
6	Фундаменты	04.01.2004	02.02.2004
	Устр-во основания и монолитной плиты	04.01.2004	02.02.2004
	Подземная часть	03.02.2004	25.02.2004
	Входы	16.02.2004	25.02.2004
	Устр-во входов	16.02.2004	25.02.2004

#### Календарно-сетевой график

1. Жилищ...  
2. Объект...  
3. Объект...  
4. Дорожн...  
5. Инжен...

Плановые сроки выполнения работ (из календарно- сетевого графика)



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

### Годовой план

Печатная форма (Приложение к Договору)	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Жилой компл	50,43					
Жилой компл	45,39					
Жилой компл	60,52					
Итого I кв.						

#### Договор подряда на СМР( Приобретение )

Тип договора: Договор подряда на СМР  
 № документа: 12/65-09  
 Дата подписания договора: 01.01.2004

Исполнитель: Промспецстрой  
 Заказчик: Субъект 1

#### График производства работ

Приложение № 2 к договору № 12/65-09 от "01" января 2004 г.  
 Утверждаю: \_\_\_\_\_ 2004 г.  
 м.п. \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Завершение работ
1	Земляные работы	01.01.2004	31.01.2004
1.1	Уст-во котлована	01.01.2004	31.01.2004
2	Электромонтажные работы	01.01.2004	25.08.2004
2.1	Сети	01.01.2004	25.08.2004
2.1.1	Монтаж электросетей	01.01.2004	25.08.2004
2.2	Оборудование	01.02.2004	29.04.2004
2.2.1	Монтаж и наладка оборудования	01.02.2004	29.04.2004
3	Фундаменты	04.01.2004	02.02.2004
3.1	Уст-во основания и монолитной плиты	04.01.2004	02.02.2004
4	Подземная часть	03.02.2004	25.02.2004



Титульные списки

Договорное обеспечение

Проектирование

Производство

Учет и контроль

### Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)																						
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.																		
Местонахождение объекта : Микрорайон №1																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Договор подряда на СМР( Приобретение )</b> </div>						50,43																		
Жилой компл	Тип договора	№ документа	Дата подписания договора			45,39																		
Жилой компл	Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004			60,52																		
Жилой компл	Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя																					
Спортивно-оз	Промспецстрой	1589429089	банк			13,87																		
Строительство	Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика			15,13																		
Торгово-разв.	Субъект 1	1223785401	Банк			35,30																		
Этапы договора																								
Детский сад	1	Подготовка территории	Аванс 10%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	2,52																		
Детский сад	2	Временные здания и сооружения	Аванс 25%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	2,65																		
Поликлиника	3	Основные объекты строительства	Аванс 30%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	8,83																		
	4	Объекты энергетического назначения	Аванс 50%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																			
	5	Объекты транспортного назначения	Оплата по факту	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																			
	6	Наружные сети и сооружения																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Справочник "Тип ПФ"</b> </div>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Условия платежа</th> <th>Кол-во дней</th> <th>Тип</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Аванс 10%</td> <td>0</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Календарные дни  <input type="radio"/> Банковские дни                             </td> </tr> <tr> <td>Аванс 25%</td> <td>0</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Календарные дни  <input type="radio"/> Банковские дни                             </td> </tr> <tr> <td>Аванс 30%</td> <td>0</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Календарные дни  <input type="radio"/> Банковские дни                             </td> </tr> <tr> <td>Аванс 50%</td> <td>0</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Календарные дни  <input type="radio"/> Банковские дни                             </td> </tr> <tr> <td>Оплата по факту</td> <td>0</td> <td> <input checked="" type="radio"/> Календарные дни  <input type="radio"/> Банковские дни                             </td> </tr> </tbody> </table>						Условия платежа	Кол-во дней	Тип	Аванс 10%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	Аванс 25%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	Аванс 30%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	Аванс 50%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	Оплата по факту	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни	
Условия платежа	Кол-во дней	Тип																						
Аванс 10%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																						
Аванс 25%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																						
Аванс 30%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																						
Аванс 50%	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																						
Оплата по факту	0	<input checked="" type="radio"/> Календарные дни <input type="radio"/> Банковские дни																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span>В архив</span> <span>Закрыто</span> </div>																								

**Выбор схемы финансирования работ по договору**



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				Итого I кв.														
		Всего	Январь	Февраль	Март															
Местонахождение объекта : Микрорайон №1																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип объекта :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Жилый компл</li> <li>Жилый компл</li> <li>Жилый компл</li> </ul> </li> <li>Тип объекта :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Спортивно-оз</li> <li>Строительство</li> <li>Торгово-разв.</li> </ul> </li> <li>Тип объекта :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Детский сад</li> <li>Детский сад</li> <li>Поликлиника</li> </ul> </li> </ul>																				
<p>Договор подряда на</p> <p>Тип договора: Договор подряда на СМР</p> <p>Исполнитель: Промспецстрой</p> <p>Заказчик: Субъект 1</p> <p>Этапы договора: <span>Дополни</span></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Этап</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Подготовка территории</td></tr> <tr><td>2</td><td>Временные здания и</td></tr> <tr><td>3</td><td>Основные объекты ст</td></tr> <tr><td>4</td><td>Объекты энергетичес</td></tr> <tr><td>5</td><td>Объекты транспортн</td></tr> <tr><td>6</td><td>Наружные сети и соор</td></tr> </tbody> </table>							№	Этап	1	Подготовка территории	2	Временные здания и	3	Основные объекты ст	4	Объекты энергетичес	5	Объекты транспортн	6	Наружные сети и соор
№	Этап																			
1	Подготовка территории																			
2	Временные здания и																			
3	Основные объекты ст																			
4	Объекты энергетичес																			
5	Объекты транспортн																			
6	Наружные сети и соор																			

График финансирования

Плановая дата	Сумма	Наименование	Вид платежа	Итого I кв.
01.01.2004	21 095 911,30р	Аванс, Декабрь	<input type="radio"/> Оплата по факту <input checked="" type="radio"/> Авансовый платеж	50,43
01.03.2004	14 206 845,24р	Оплата, Март	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	45,39
01.04.2004	17 082 040,14р	Оплата, Апрель	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	60,52
01.05.2004	22 958 261,91р	Оплата, Май	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	13,87
01.06.2004	25 853 898,51р	Оплата, Июнь	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	15,13
01.09.2004	42 202 687,32р	Оплата, Сентябрь	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	35,30
01.10.2004	38 263 769,82р	Оплата, Октябрь	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	2,52
01.11.2004	14 946 785,10р	Оплата, Ноябрь	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	2,65
01.12.2004	14 348 913,66р	Оплата, Декабрь	<input checked="" type="radio"/> Оплата по факту <input type="radio"/> Авансовый платеж	8,83

Диаграмма



**Расчет плана финансирования по договору (в соответствии с выбранной схемой финансирования)**

- 3.Объект
  - 4.Дорож
  - 5.Инжен
- В архив
- Закрыто

OK Отмена

Закрыто



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Тип объекта : Жилой компл						
Жилой компл						
Жилой компл						
Жилой компл						
Тип объекта : Спортивно-оз						
Строительство						
Торгово-разв						
Тип объекта : Детский сад						
Детский сад						
Детский сад						
Поликлиника						
Итого I кв.						
План капитальных в						
Стру						
59,3						
6						
Наружные сети и соор						

**Договор подряда на**

Тип договора: Договор подряда на СМР

Исполнитель: Промспецстрой

Заказчик: Субъект 1

Этапы договора

№	Этап
1	Подготовка территории
2	Временные здания и
3	Основные объекты ст
4	Объекты энергетичес
5	Объекты транспортн
6	Наружные сети и соор

**График финансирования**

Плановая дата	Сумма	Наименование	Вид платежа	Итого
01.01.2004	21 095 911,30р	Аванс, Декабрь	Оплата по факту	50,43
01.03.2004	14 206 845,24р	Оплата Март	Авансовый платеж	45,39
01.04.2004	17 082 040,14р	Оплата	Оплата по факту	60,52
01.05.2004	22 958 261,91р	Оплата		
01.06.2004	25 853 898,51р	Оплата		
01.09.2004	42 202 687,32р	Оплата		
01.10.2004	38 263 769,82р	Оплата		
01.11.2004	14 946 785,10р	Оплата		
01.12.2004	14 348 913,66р	Оплата		

**График финансирования**

Плановая дата: 01.01.2004


Сумма: 21 095 911,30р.

Наименование: Аванс, Декабрь

Вид платежа: 1

OK Отмена

**Расчет плана финансирования по договору (в соответствии с выбранной схемой финансирования)**

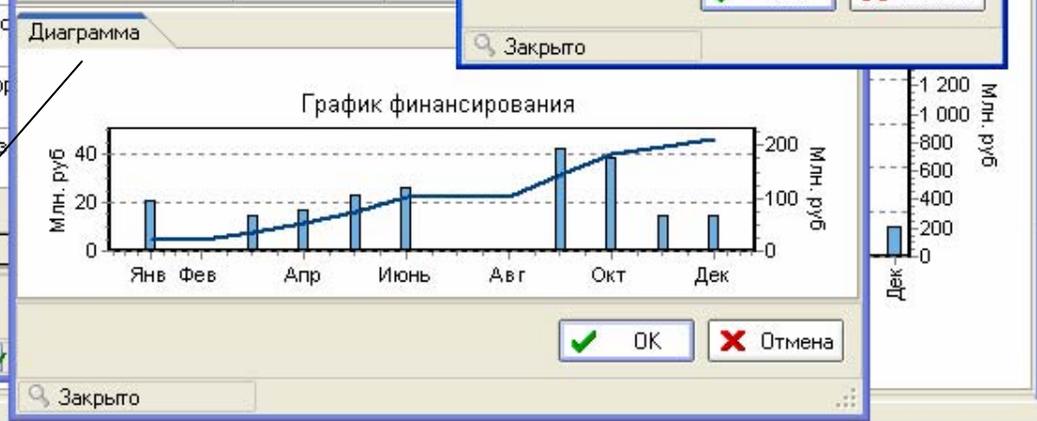



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

### Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)																																																				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.																																																
Местонахождение объекта : Микрорайон №1																																																						
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <b>Договор подряда на СМР( Приобретение )</b> </div>						50,43																																																
<table border="1"> <tr> <td>Тип договора</td> <td>№ документа</td> <td>Дата подписания договора</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Договор подряда на СМР</td> <td>12/65-09</td> <td>01.01.2004</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td>ИНН исполнителя</td> <td>Банк исполнителя</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Промспецстрой</td> <td>1589429089</td> <td>банк</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Заказчик</td> <td>ИНН заказчика</td> <td>Банк заказчика</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Субъект 1</td> <td>1223785401</td> <td>Банк</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Тип договора	№ документа	Дата подписания договора				Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004				Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя				Промспецстрой	1589429089	банк				Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика				Субъект 1	1223785401	Банк				45,39												
Тип договора	№ документа	Дата подписания договора																																																				
Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004																																																				
Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя																																																				
Промспецстрой	1589429089	банк																																																				
Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика																																																				
Субъект 1	1223785401	Банк																																																				
						60,52																																																
						13,87																																																
						15,13																																																
						35,30																																																
						2,52																																																
						2,65																																																
						8,83																																																
						Выбор...																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование</th> <th>Дата начал</th> <th>Дата оконч</th> <th>Сумма</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Подготовка территории строительства</td> <td>04.01.2004</td> <td>23.01.2004</td> <td>15669029,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Временные здания и сооружения (подготовительный период)</td> <td>06.01.2004</td> <td>20.02.2004</td> <td>0,00р.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Основные объекты строительства</td> <td>01.01.2004</td> <td>22.12.2004</td> <td>210 959 113,00р.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Объекты энергетического хозяйства</td> <td>03.07.2004</td> <td>28.07.2004</td> <td>46 891 874,80р.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Объекты транспортно</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Наружные сети и соор</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Благоустройство и оз</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						№	Наименование	Дата начал	Дата оконч	Сумма		1	Подготовка территории строительства	04.01.2004	23.01.2004	15669029,4		2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)	06.01.2004	20.02.2004	0,00р.		3	Основные объекты строительства	01.01.2004	22.12.2004	210 959 113,00р.		4	Объекты энергетического хозяйства	03.07.2004	28.07.2004	46 891 874,80р.		5	Объекты транспортно					6	Наружные сети и соор					7	Благоустройство и оз					
№	Наименование	Дата начал	Дата оконч	Сумма																																																		
1	Подготовка территории строительства	04.01.2004	23.01.2004	15669029,4																																																		
2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)	06.01.2004	20.02.2004	0,00р.																																																		
3	Основные объекты строительства	01.01.2004	22.12.2004	210 959 113,00р.																																																		
4	Объекты энергетического хозяйства	03.07.2004	28.07.2004	46 891 874,80р.																																																		
5	Объекты транспортно																																																					
6	Наружные сети и соор																																																					
7	Благоустройство и оз																																																					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <b>Прохождение документом визирования</b> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Департамент</th> <th>Визирует</th> <th>Передано на виз-е</th> <th>Виза получена</th> <th>Срок визирования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Согласование Отдел 1</td> <td>Да</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Согласование Отдел 2</td> <td>Да</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Согласование Отдел 3</td> <td>Да</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Департамент	Визирует	Передано на виз-е	Виза получена	Срок визирования	Согласование Отдел 1	Да				Согласование Отдел 2	Да				Согласование Отдел 3	Да																																
Департамент	Визирует	Передано на виз-е	Виза получена	Срок визирования																																																		
Согласование Отдел 1	Да																																																					
Согласование Отдел 2	Да																																																					
Согласование Отдел 3	Да																																																					

**Согласование проекта договора**



Титульные списки

Договорное обеспечение

Проектирование

Производство

Учет и контроль

Аналитика и отчетность

Настройки

### Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Жилой компл						50,43
Жилой компл						45,39
Жилой компл						60,52
Спортивно-оз						13,87
Строительство						15,13
Торгово-разв						35,30
Детский сад						2,52
Детский сад						2,65
Поликлиника						8,83
<b>(Итого I кв.)</b>						<b>259,3</b>

#### Договор подряда на СМР( Приобретение )

Тип договора: Договор подряда на СМР | № документа: 12/65-09 | Дата подписания договора: 01.01.2004

Исполнитель: Промспецстрой | ИНН исполнителя: 1589429089 | Банк исполнителя: банк

Заказчик: Субъект 1 | ИНН заказчика: 1223785401 | Банк заказчика: Банк






№	Наименование	Дата начал	Дата оконч	Сумма
1	Подготовка территории строительства	04.01.2004	23.01.2004	15 669 029,40р.
2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)	06.01.2004	20.02.2004	0,00р.
3	Основные объекты строительства	01.01.2004	22.12.2004	210 959 113,00р.
4	Объекты энергетического хозяйства	03.07.2004	28.07.2004	46 891 874,80р.
5	Объекты транспортного хозяйства и связи	25.06.2004	27.06.2004	38 885 945,00р.
6	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, т	03.12.2004	14.12.2004	6 458 786,40р.
7	Благоустройство и озеленение	15.06.2004	10.08.2004	0,00р.
				<b>1 142 715 599,60</b>

Статус документа: **Договор подписан**

# Поставка материально-технических ресурсов

Спецификации от проектировщика

Заказчик




Завершение поставок

Поставка заказчика

Поставка подрядчика

Генподрядчик




Поставщики

# Заказ материально-технических ресурсов

Спецификации от проектировщика

Заказчик




Подготовка разделительн. ведомостей

Плановые сроки поставок (по графику стр-ва)

Расчет предельных сроков заказа МТР

Заказ МТР



Начало поставок

Поставка заказчика /  
Поставка подрядчика

Поставка заказчика

Поставка подрядчика

Генподрядчик

Спецификации к договору подряда

Поставщики

Договоры поставки  
Спецификации к договорам



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Заказные спецификации

№ ПСД	Местонахождение	Тип объекта строительства	Дата	Тип стро	Проектировщик
CO1	Микрорайон №1	1.Жилищное строительство	03.02.2004	Секция 1	Гипростройпроект
CO2	Микрорайон №1	1.Жилищное строительство	03.02.2004	Секция 2	Гипростройпроект
CO3	Микрорайон №1	1.Жилищное строительство	03.02.2004	Секция 3	Гипростройпроект
CO4	Микрорайон №1	1.Жилищное строительство	18.02.2004	Секция № 4	Гипростройпроект

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Секция 1  
 №ПСД: CO1

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель
Наименование : Секция 1				
Тип : Блоки стеновые				
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14
Тип : Внутренние стеновые панели				
CO1	Внутренние стеновые панели В 1-1-1	Штука	85	Спецжелезобетон-ЖБИ-52
CO1	Внутренние стеновые панели В 1-1-3	Штука	17	Спецжелезобетон-ЖБИ-52
CO1	Внутренние стеновые панели В1-1-4	Штука	17	Спецжелезобетон-ЖБИ-52
CO1	Внутренние стеновые панели В1-2а	Штука	1	Спецжелезобетон-ЖБИ-52
CO1	Внутренние стеновые панели В1-2а-1	Штука	17	Спецжелезобетон-ЖБИ-52
CO1	Внутренние стеновые панели В1-5	Штука	1	Спецжелезобетон-ЖБИ-52

**Потребности в материально-технических ресурсах (на основании ПСД)**



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1 | Тип объекта: 1.Жилищное строительство | Объект строительства: Жилой комплекс № 1 | №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Подрядчик/Заказчик
Наименование : Секция 1					
Тип : Блоки стеновые					
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели					
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	5	Комбинат ЖБИ-14	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-1	Штука	59	Комбинат ЖБИ-14	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-6	Штука	66	Комбинат ЖБИ-14	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2-1	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-1	Штука	56	Спецстройбетон-ЖБИ-12	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-12	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-12	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-12	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик

Поставка заказчика

Поставка подрядчика

- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик

- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик

- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик
- Подрядчик
- Заказчик


# Работы



▼ Макет: Ввод плановых данных

Фильтр: Все работы

ID работы	Название работы
<b>Жилой комплекс: № 1</b>	
<b>Подготовка территории строительства</b>	
SMP1110	Вырубка деревьев
SMP1120	Вертикальная планировка
SMP1130	Устройство ограждения
Снос строений, разборка пр, отвод участка	
Геодезия	
Перекладка инженерных сетей из пятна застройки	
Очистка территории от деревьев и кустарников	
Прочее	
<b>Основные объекты строительства</b>	
Земляные работы	
SMP1160	Уст-во котлована
Фундаменты	
SMP 1170	Устр-во основания и монолитной плиты
Подземная часть	
SMP2080	Монтаж цокольного этажа
Входы	
SMP2090	Устр-во входов
Перегородки	
Надземная часть	
Внутренний каркас	
SMP2390	Монтаж 1-го этажа

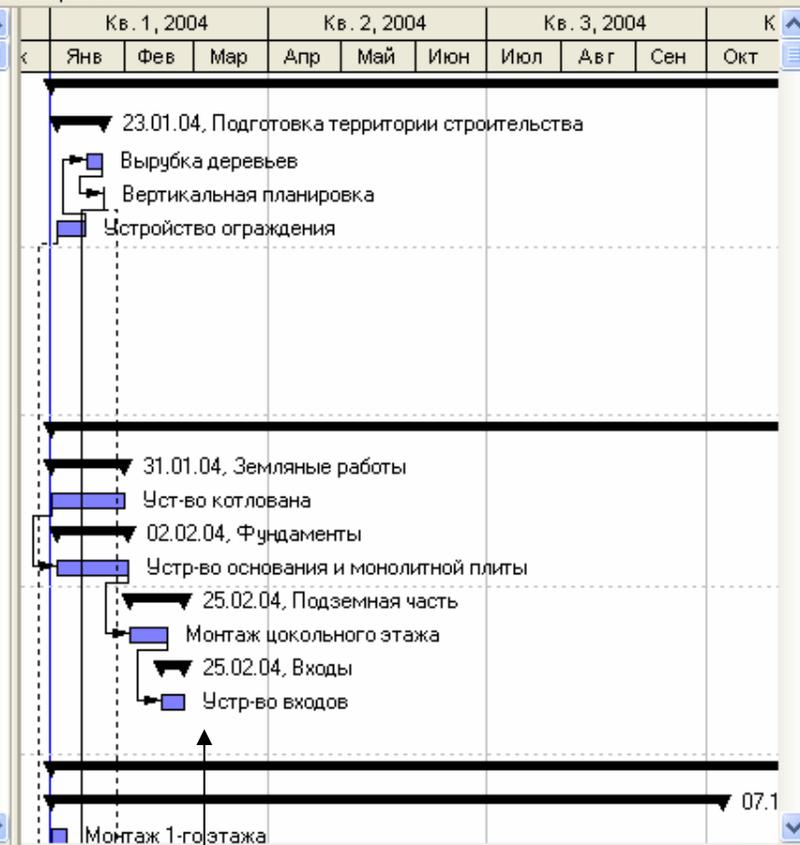

Новый

Удалить

Вырезать

Копировать

Вставить

Ресурсы

Рес. по роли

Роли

Коды работ

Предшествен...

Последователи

Общее	Статус	Ресурсы	Коды	Заметки	Шаги	Документы	Расходы	Последователи	Предшественники	Зависимости
Работа										Проект
Статья затрат										

**Календарно-сетевой график**



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1

### План поставки

Календарный план

- Жилой комплекс № 1
  - Строительно-монтажные
    - Подготовка территории
    - Временные здания и сооружения
    - Основные объекты строительства
      - Земляные работы
      - Электромонтажные работы
      - Фундаменты
      - Подземная часть
        - Надземная часть
          - Внутренний ка...
            - 1 этаж
            - 2-5 этаж
            - Поставка
            - Поставка

№ ЗС	Тип	Наименование	Ед.	Кол-во	Н
	Блоки стеновые	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	шт	55	0
	Внутренние стеновые панели техподполья	Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ6-1	шт	41	0
	Колонны	Колонны К-2	шт	70	35
	Колонны	Колонны К-3	шт	20	20
	Колонны	Колонны К-4	шт	30	30
	Лестничные марши и лестницы	Лестничные марши и лестницы ЛМ 200	шт	53	53
	Обвязочные балки	Обвязочные балки ОБ-1	шт	30	30
	Панели лифтов	Панели лифтов ПЛ 403	шт	20	20
	Плиты перекрытий	Плиты перекрытий П211	шт	56	0
	Электропанели	Электропанели ЭП 3	шт	10	10
	Элементы лоджий	Элементы лоджий ЭЛ 1-3	шт	30	0

Реестр MTP по вехе | План поставок

Тип	Наименование	Ед.	Кол-во
Блоки стеновые	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	шт	55
Внутренние стеновые панели техподполья	Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ6-1	шт	41
Колонны	Колонны К-2	шт	35
Плиты перекрытий	Плиты перекрытий П211	шт	56
Элементы лоджий	Элементы лоджий ЭЛ 1-3	шт	30

WBS проекта

Номенклатура поставляемых MTP

Привязка номенклатуры поставки MTP к графику производства работ по объекту (привязка к WBS)

OK Отмена



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок пост.	Подрядчик/Заказчик
Наименование : Секция 1						
Тип : Блоки стеновые						
CO1	Блоки стеновые Ф				17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые Ф			14	05.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые Ф				25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели						
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	5	Комбинат ЖБИ-14	30.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-1	Штука	59	Комбинат ЖБИ-14	17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-6	Штука	66	Комбинат ЖБИ-14	08.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2-1	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	27.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2	Штука	2	Комбинат ЖБИ-14	03.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-1	Штука	56	Спецстройбетон-ЖБИ-14	12.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-14	16.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-14	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-14	20.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик

**Плановые сроки  
окончания поставки  
(на основании графика  
производства работ)**





-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок пост.	Подрядчик/Заказчик
Наименование : Секция 1						
Тип : Блоки стеновые						
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т				17.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т				05.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т				25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т				10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутр						
CO1	Внутр		1		30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутр				30.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6				17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5				08.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5				27.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5				03.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5				12.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4				16.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-12	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-12	20.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик

**Справочник материально-т...**

Наименование: Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т

Сокр.наим.: ФБС 9.3.6-т

Номер чертежа: [ ]

Ед.Изм: шт

Срок доставки (в днях): **75**

OK Отмена

Просмотр

**Сроки доставки  
(из справочника MTP)**

75



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.пос	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	19.05.2004	10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	21.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	5	Комбинат ЖБИ-14	21.05.2004	30.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-1	Штука	59	Комбинат ЖБИ-14	08.05.2004	17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-6	Штука	66	Комбинат ЖБИ-14	29.04.2004	08.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2-1	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	18.05.2004	27.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-4	Штука	114	Комбинат ЖБИ-14	24.04.2004	03.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-14	03.05.2004	12.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-14	07.05.2004	16.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-14	16.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-14	16.05.2004	20.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик

**Предельный срок заказа MTP**

**Плановые сроки окончания поставки по графику строительства**



**Печатная форма  
«График поставок»**

-  План поставок
-  Прайс-листы
-  **Печать документа**
-  Спецификации
-  Заказ МТР
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1 | Тип объекта: 1.Жилищное строительство | Объект строительства: Жилой комплекс № 1 | №ПСД: 328/25-09

**4. Управление поставками - План поставок**

Q22

Утверждаю:  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 2004 г.

**План поставок материально-технических ресурсов**  
Объект строительства: Жилой комплекс № 1

№ п.п.	ID работы	Наименование работы	Срок поставки
10			
11	12.23.1234	Поставка для монтажа 15-го этажа	01.09.2004
12	1	Внутренние панели	
13	2	Внутренние панели В1-1х	23 шт
14	3	Внутренние панели В4-3	4 шт
15	4	Внутренние панели В6-2	6 шт
16	5	Внутренние панели ВЦ-6х	3 шт
17	6	Блоки стеновые	
18	7	Блоки стеновые ФБС 9.5.6	шт 3
19	12.23.1423	Поставка для монтажа 19-го этажа	01.10.2004
20	1	Внутренние панели	
21	2	Внутренние панели В1-1-4х	шт 8

С01	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-12	20.06.2004	Заказчик
						Подпалчик



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ МТР
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

### Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование МТР	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.пос	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	19.05.2004	10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	21.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	5	Комбинат ЖБИ-14	21.05.2004	30.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-1	Штука	59	Комбинат ЖБИ-14	08.05.2004	17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-6	Штука	66	Комбинат ЖБИ-14	29.04.2004	08.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2-1	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	18.05.2004	27.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-4	Штука	14	Завод ЖБИ-48	24.04.2004	03.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-14	03.05.2004	12.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-14	07.05.2004	16.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-14	16.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-14	16.05.2004	20.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик

**Предельный срок заказа МТР**

**Плановые сроки окончания поставки по графику строительства**



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок пост.	Подрядчик/Заказчик
Наименование : Секция 1						
Тип : Блоки стеновые						
CO1	Блоки стеновые Ф					
CO1	Блоки стеновые Ф					
CO1	Блоки стеновые Ф					
CO1	Блоки стеновые Ф					
Тип : Внутренние стеновые панели						
CO1	Внутренние стеновые панели В4-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-12	30.06.2004	Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-12	20.06.2004	Заказчик

**Дизайнер фильтра - [untitled.ftl]**

Фильтр: **ВСЕ** <корень>

- ... **Наименование MTP** равно Блоки стеновые
- ... **Срок нач.пост.** больше или равно чем 01.03.2004
- ... **Срок нач.пост.** меньше или равно чем 01.06.2004
- ... **Подрядчик/Заказчик** равно
- ... **Тип** равно <пусто>

нажмите кнопку для добавления нового условия

**Выбор номенклатуры для заказа оборудования и материалов (анализ предельных сроков заказа MTP)**

Открыть... Сохранить как... OK Отмена Применить



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование МТР	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.по	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	19.05.2004	10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	21.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	5	Комбинат ЖБИ-14	21.05.2004	30.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-1	Штука	1	Комбинат ЖБИ-14	21.05.2004	17.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В6-2	Штука	1	Комбинат ЖБИ-14	21.05.2004	08.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2-1	Штука	85	Комбинат ЖБИ-14	18.05.2004	27.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-2	Штука	2	Комбинат ЖБИ-14	24.04.2004	03.06.2004	<input checked="" type="radio"/> Подрядчик <input type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В5-1	Штука	56	Спецстройбетон-ЖБИ-12	03.05.2004	12.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-3	Штука	34	Спецстройбетон-ЖБИ-12	07.05.2004	16.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2-1	Штука	16	Спецстройбетон-ЖБИ-12	16.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В4-2	Штука	3	Спецстройбетон-ЖБИ-12	06.05.2004	20.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик

**Заказ МТР у поставщиков  
(подготовка спецификаций на поставку)**



**Подготовка договора на поставку**

- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед. и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.по	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	● Подрядчик ● Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	● Подрядчик ● Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	● Подрядчик ● Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука				10.07.2004	● Подрядчик ● Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели					30.06.2004	○ Подрядчик ● Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					30.06.2004	● Подрядчик ○ Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					17.06.2004	● Подрядчик ○ Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					08.06.2004	● Подрядчик ○ Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					27.06.2004	● Подрядчик ○ Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					03.06.2004	● Подрядчик ○ Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					12.06.2004	○ Подрядчик ● Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					16.06.2004	○ Подрядчик ● Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					30.06.2004	○ Подрядчик ● Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели					20.06.2004	○ Подрядчик ○ Заказчик

**Договор:**

Тип договора: **Договор поставки**      № документа: **26/12-08 от 12.01.2004**

Дата подготовки проекта договора: 04.04.2004      Дата подписания договора: 12.01.2004

Программа/Проект: Структура проекта

Документы    Этапы/Объекты    История

Документ основание: [ ]

Исполнитель: **Спецснабтехкомплект**

Банк исполнителя: [ ]

Банк: [ ]

Стоимость: 0,00р.      Условия авансового платежа (работы): [ ]



# Номенклатура поставки

- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

## Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.изм.	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.пост.	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	Подрядчик Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	Подрядчик Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	Подрядчик Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	19.05.2004	10.07.2004	Подрядчик Заказчик

Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели ВШБ	Штука	9	Завод ЖБИ-48	21.05.2004	30.06.2004	Подрядчик

### Спецификация к Договору

Номер: test1      Дата: 04.04.2004

Документ-основание: 26/12-08 от 12.01.2004 от 12.01.2004 Новый этап

Объект: Жилой комплекс № 1

Поставщик: Спецснабтехкомплект      Изготовитель: Нет

Заказчик: Субъект 1      Грузополучатель: Центральный склад

Номенклатура	Дополнительно	Исполнение			
Наименование MTP	Кол-во	Цена/база	Ед.из	Сумма	НДС
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	307,00р.	шт	1 535,00р.	НДС 18 % кроме того
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	418,00р.	шт	2 926,00р.	НДС 18 % кроме того
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	33	230,00р.	шт	7 590,00р.	НДС 18 % кроме того
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	640,00р.	шт	13 440,00р.	НДС 18 % кроме того



# Номенклатура поставки

- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ MTP
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Комплектовочная ведомость**

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование MTP	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.пос	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Блоки стеновые							
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	Штука	5	Завод ЖБИ-48	13.04.2004	17.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	Штука	33	Комбинат ЖБИ-14	22.03.2004	05.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	Штука	7	Завод ЖБИ-48	26.04.2004	25.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	Штука	21	Комбинат ЖБИ-14	19.05.2004	10.07.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
Тип : Внутренние стеновые панели							
CO1	Внутренние стеновые панели ВЦ6	Штука	9	Завод ЖБИ-48	21.05.2004	30.06.2004	<input type="radio"/> Подрядчик <input checked="" type="radio"/> Заказчик
CO1	Внутренние стеновые панели В1-1-1	шт	85	501,21р.			
CO1	Внутренние стеновые панели В2-1	шт	1	512,12р.			
CO1	Внутренние стеновые панели В2-4*-1	шт	34	605,56р.			
CO1	Внутренние стеновые панели В2-7	шт	17	750,87р.			

**Спецификация к Договору**

Номер: test2      Дата: 04.04.2004

Документ-основание: 35-27/16 от 14.01.2004 от 14.01.2004 Новый этап

Объект: Жилой комплекс № 1

Поставщик: Монтажстройнаб      Изготовитель: Нет

Заказчик: Субъект 1      Грузополучатель: Региональный склад 1

Наименование MTP	Кол-во	Цена/база	Ед.из	Сумма	НДС
Внутренние стеновые панели В 1-1-1	85	501,21р.	шт	42 602,85р.	НДС 18 % кроме того
Внутренние стеновые панели В2-1	1	512,12р.	шт	512,12р.	НДС 18 % кроме того
Внутренние стеновые панели В2-4*-1	34	605,56р.	шт	20 589,04р.	НДС 18 % кроме того
Внутренние стеновые панели В2-7	17	750,87р.	шт	12 764,79р.	НДС 18 % кроме того



**Печатная форма «Спецификация на поставку МТР»**

- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ МТР
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Комплектовочная ведомость

Местонахождение объекта: Микрорайон №1  
 Тип объекта: 1.Жилищное строительство  
 Объект строительства: Жилой комплекс № 1  
 №ПСД: 328/25-09

№ ЗС	Наименование МТР	Ед.и	Кол-во	Изготовитель	Срок нач.пос.	Срок пост.	Подрядчик/З
Наименование : Секция 1							
Тип : Бескаркасная							

Печать документа

**Приход от поставщиков - Заказная Спецификация**

75%

**B I U G**

U21

№	В	C	D	E	F	G	H	I	J
2	<b>Спецификация к Договору на поставку оборудования Netest1 от 04.04.2004г.</b>								
3	Приложение к договору : 26/12-08 от 12.01.2004 от 12.01.2004								
4	Поставщик: ОАО "Спецснабтехкомплект"								
5	Отправитель: ОАО "Спецснабтехкомплект"								
6	Шифр проекта: ЖС 1 / 132043								
7	<b>Заказано</b>								
8	№	Наименование оборудования	№ заказа	Ед.изм.	Кол-во	Цена (б.НДС) руб.	Сумма (б.НДС) руб.	НДС (проже 10%) руб.	Сумма (с НДС) руб.
9	1	Блоки стеновые ФБС 9 А 6-т		шт	5	307,00	1 535,00	276,30	1 811,30
10	2	Блоки стеновые ФБС 12 А 6-т		шт	7	418,00	2 926,00	526,68	3 452,68
11	3	Блоки стеновые ФБС 9 З 6-т		шт	33	230,00	7 590,00	1 366,20	8 956,20
12	4	Блоки стеновые ФБС 12 З 6-т		шт	21	640,00	13 440,00	2 419,20	15 859,20
13									
14		<b>Итого:</b>			66		25 491,00	4 588,38	30 079,38

Итоговая сумма (прописью): Тридцать тысяч семьдесят девять рублей 38 копеек

Получатель: ОАО "Спецснабтехкомплект" Центральный склад, ОКПО , ИНН 436567456456

Режиссеры Получателя:


Покупатель:

Заказчик: \_\_\_\_\_ ОАО "Спецснабтехкомплект" \_\_\_\_\_

# Контроль поставок МТР на объекты строительства

ПЛАН ПОСТАВОК

Заказчик



Контроль номенклатуры, сроков и стоимости поставляемых МТР

Складская логистика

Контроль сроков передачи МТР под монтаж

Завершение поставок

Поставка заказчика

Поставка подрядчика

Генподрядчик

Поставка МТР на объекты строительства

Приемка / передача МТР под монтаж

Поставка МТР на объекты строительства

Поставщики



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

## Контроль поставок MTP на объекты строительства

### Сроки поставок (план / факт)

Оборудование	Количество		Стоимость		Срок передачи под монтаж	
	Заказано	Отгружено	Заказано	Отгружено	План	Факт
Объект : Жилой комплекс № 1						
[-] Тип оборудования : Блоки стеновые						
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	5	1539,1	1539,1	17.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	2926,77	2926,77	25.06.2004	06.04.2004
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	33	23	7605,18	5300,58	05.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	21	4191,18	4191,18	10.07.2004	06.04.2004
[-] Тип оборудования : Внутренние стеновые панели						
Внутренние стеновые панели В 1-1-1	85	60	30273,6	21369,6	19.06.2004	
Внутренние стеновые панели В 1-1-3	17	17	4877,47	4877,47	03.07.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-1-4	17	17	7696,75	7696,75	11.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-2а	1	1	869,42	869,42	10.07.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-2а-1	17	17	6846,92	6846,92	30.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-5	1	0	1242,2	0	30.06.2004	
Внутренние стеновые панели В2-1	1	1	1145,3	1145,3	10.07.2004	
Внутренние стеновые панели В2-4*1	34	34	19288,88	19288,88	05.06.2004	
Внутренние стеновые панели В2-7	17	17	8013,46	8013,46	11.07.2004	
Внутренние стеновые панели В3-1-1	51	51	32066,25	32066,25	30.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В4	18	18	8775,36	8775,36	18.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В4-1	17	17	7331,08	7331,08	12.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-2	3	3	1459,35	1459,35	20.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-2-1	16	16	6378,72	6378,72	30.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-3	34	0	9662,8	0	16.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-1	36	0	1334,8	0	12.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-2	2	0	1134,8	0	03.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-2-1	85	65	26829,4	20516,6	27.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-6						04
Внутренние стеновые панели В6-1						04

**Номенклатура, количество, стоимость (план / факт)**



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

## Контроль поставок MTP на объекты строительства

Оборудование	Количество		Стоимость		Срок передачи под монтаж	
	Заказано	Отгружено	Заказано	Отгружено	План	Факт
Объект : Жилой комплекс № 1						
Тип оборудования : Блоки стеновые						
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	5	1539,1	1539,1	17.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	2926,77	2926,77	25.06.2004	06.04.2004
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	33	23	7605,18	5300,58	05.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21				07.2004	06.04.2004
Тип оборудования : Внутренние стеновые панели						
Внутренние стеновые панели В 1-1-1	85				06.2004	
Внутренние стеновые панели В 1-1-3	17	17	4877,47	4877,47	03.07.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-1-4	17	17	7696,75	7696,75	11.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-2а	1					
Внутренние стеновые панели В1-2а-1	17					
Внутренние стеновые панели В1-5	1					
Внутренние стеновые панели В2-1	1					
Внутренние стеновые панели В2-4*1	34					
Внутренние стеновые панели В2-7	17					
Внутренние стеновые панели В3-1-1	51					
Внутренние стеновые панели В4	18					
Внутренние стеновые панели В4-1	17					
Внутренние стеновые панели В4-2	3					
Внутренние стеновые панели В4-2-1	16					
Внутренние стеновые панели В4-3	34					
Внутренние стеновые панели В5-1	56					
Внутренние стеновые панели В5-2	2					
Внутренние стеновые панели В5-2-1	85					
Внутренние стеновые панели В5-6	66					
Внутренние стеновые панели В6-1	59					

Приемка MTP на склад

**Акт приема оборудования**

Номер:  Дата:

Документ-основание:  [Просмотр](#)

Объект:

Исполнитель:

Грузоотправитель:

Номенклатура Дополнительно

Наименование	Кол-во	Цена/база	Ед.
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	199,58р.	шт
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	23	230,46р.	шт
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	418,11р.	шт
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	307,82р.	шт



- План поставок
- Прайс-листы
- Спецификации
- Заказ МТР
- Контроль поставок
- Складская логистика
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Реестр складов**

Наименование	Адрес
Центральный склад	Московская область, г. Люберцы, Котельнический ту
Региональный склад 1	Калужская область, г. Обнинск, ул. П.Сидорова д.23/
Региональный склад 2	Рязанская область, г. Захарово, ул. Петрова д.19/2-1
Региональный склад 3	Владимирская область, г. Юрьев-Польский ул. Ивано
Региональный склад 4	Тверская область, г. Конаково, пр-д Энергетиков д.6,



**Реестр складов**

**Контроль поставок МТР**

Оборудование	Количество			Всего	В пути
	Остаток	Зарезервировано			
- Склад : Центральный склад					
- Тип оборудования : Блоки стеновые					
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	0	5	0	
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	0	0	
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	23	15	8	0	
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	21	0	0	
- Тип оборудования : Внутренние стеновые панели техподполья					
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ1-1	10	0	10	0	
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ3-1	1	0	1	0	

**Складские запасы**

Перечень

№	Дата	Вид	Док.основание	Поставщик
Спецификация 2	06.04.2004	Спецификация к Договору	35-27/16 от 14.01.2004 от 01.04.2004	Новый эт. Монтажстройснаб
НК-2	06.04.2004	Акт приема оборудования	от	Монтажстройснаб
Акт -2	06.04.2004	Акт передачи оборудования в монт	от	Субъект 1



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ МТР
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

Приход от поставщиков - Приходный ордер М-4

057

**B I U G** [Icons] [80%]

057

В С D E F G H I J K L M N O

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № НК-1**

Типовой межкорпоративной формы № М-4  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Коды
315003

Организация: Субъект 1  
Структурное подразделение: Центральный склад

Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик		Страховая компания	Корреспондирующий счет		Номер документа	
			наименование	код		счет, субсчет	код аналитического учета	сопроводительного	платежного
6.4.2004			Спецнабтехкомплект			60.1			

Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской карте
наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	по документу	принято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	50311	145	Штука		21,000	199,58	4 191,18	754,41	4 945,59		
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	50310	145	Штука		23,000	230,46	5 300,58	954,10	6 254,68		
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	50309	145	Штука		7,000	418,11	2 926,77	526,82	3 453,59		
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	50308	145	Штука		5,000	307,82	1 539,10	277,04	1 816,14		
Итого					56,000	X	13957,63	2 512,37	16470		

Принял \_\_\_\_\_ Сдал \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_





-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ МТР
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

5. Складская логистика - Инвентаризационная опись № ИНВ-3

80%

**B I U G** [List of icons]

M79

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													Унифицированная форма № ИНВ-3
2													Утверждена постановлением Госкомстата РФ
3													от 18 августа 1998 г. № 88
4													Код
5													317004
6													
7		Субъект 1									Форма по ОКУД		
8			организация								Форма по ОКУД		
9		Центральный склад											
10			структурное подразделение								Вид деятельности		
11													
12													Номер
13													Дата
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													Номер док.
21													Дата сост.
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ  
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

находящиеся в собственности организации, полученные для переработки

**РАСПИСКА**

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на 13.08.2004 г.

2-я и 3-я страницы формы №ИНВ-3


№	Счет, субсчет	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Цена, руб.коп.	Номер		Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		наименова-	код (номе-	код по	наимено-		инвен-	пасп-	кол-во	сумма,	кол-во	сумма,



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

### Реестр складов

Наименование	Адрес
Центральный склад	Московская область, г. Люберцы, Котельнический ту
Региональный склад 1	Калужская область, г. Обнинск, ул. П.Сидорова д.23/
Региональный склад 2	Рязанская область, г. Захарово, ул. Петрова д.19/2-1
Региональный склад 3	Владимирская область, г. Юрьев-Польский ул. Ивано
Региональный склад 4	Тверская область, г. Конаково, пр-д Энергетиков д.6,

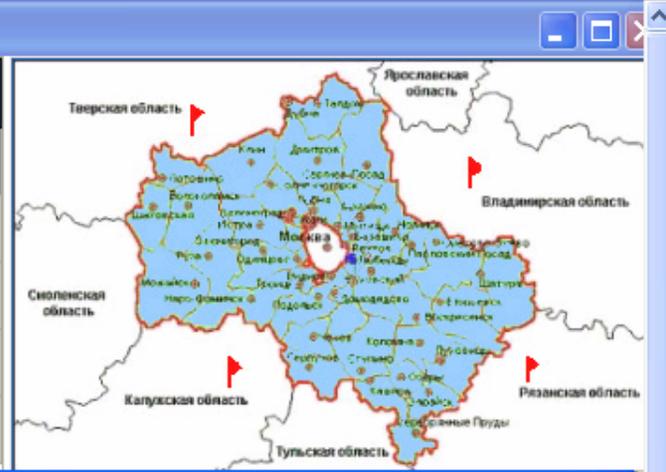

### Контроль поставок MTP

Оборудование	Количество		Всего	В пути
	Остаток	Зарезервировано		
- Склад : Центральный склад				
- Тип оборудования : Блоки стеновые				
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	0	5	0
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	0	0
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	23	15	8	0
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	21	0	0
- Тип оборудования : Внутренние стеновые панели техподполья				
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ1-1	10	0	10	0
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ3-1	1	0	1	0

#### Перечень

№	Дата	Вид	Док.основание	Поставщик
Спецификация 2	06.04.2004	Спецификация к Договору	35-27/16 от 14.01.2004 от 01.04.2004 Новый эт.	Монтажстройснаб
НК-2	06.04.2004	Акт приема оборудования	от	Монтажстройснаб
Акт -2	06.04.2004	Акт передачи оборудования в монт	от	Субъект 1



План поставок

Прайс-листы

Спецификации

Заказ МТР

Контроль поставок

Складская логистика

Аналитика и отчетность

Настройки

**Реестр складов**

Наименование	Адрес
Центральный склад	Московская область, г. Люберцы, Котельнический тупик 12
Региональный склад 1	Калужская область, г. Обнинск, ул. П.Сидорова д.23/11
Региональный склад 2	Рязанская область, г. Захарово, ул. Петрова д.19/2-1
Региональный склад 3	Владимирская область, г. Юрьев-Польский ул. Иванова д.2
Региональный склад 4	Тверская область, г. Конаково, пр-д Энергетиков д.6/1

**Реестр складов**



**Контроль поставок МТР**

Оборудование	Количество		Всего	В пути
	Остаток	Зарезервировано		
- Склад : Центральный склад				
- Тип оборудования: Блоки стеновые				
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т				
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т				
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т				
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т				
- Тип оборудования: Внутренние стеновые панели техподполья				
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ1-1				
Внутренние стеновые панели техподполья СВЦ2-1				

Перечень

№	Дата	Вид	
Спецификация 1	06.04.2004	Спецификация к Договору	26/12
НК-1	06.04.2004	Акт приема оборудования	от

**Акт приема оборудования**

Номер:  Дата:

Документ-основание:

Объект:

Исполнитель:

Грузоотправитель:

Номенклатура

Наименование	Кол-во	Цена/база	Ед.
Внутренние стеновые панели В5-2-1	65	315,64р.	шт
Внутренние стеновые панели В4-2-1	16	398,67р.	шт



-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

## Контроль поставок MTP на объекты строительства

## Сроки поставок (план / факт)

Оборудование	Количество		Стоимость		Срок передачи под монтаж	
	Заказано	Отгружено	Заказано	Отгружено	План	Факт
Объект : Жилой комплекс № 1						
Тип оборудования : Блоки стеновые						
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	5	1539,1	1539,1	17.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	2926,77	2926,77	25.06.2004	06.04.2004
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	33	23	7605,18	5300,58	05.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	21	4191,18	4191,18	10.07.2004	06.04.2004
Тип оборудования : Внутренние стеновые панели						
Внутренние стеновые панели В 1-1-1	85	60	30273,6	21369,6	19.06.2004	
Внутренние стеновые панели В 1-1-3	17	17	4877,47	4877,47	03.07.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-1-4	17	17	7696,75	7696,75	11.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-2а	1	1	869,42	869,42	10.07.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-2а-1	17	17	6846,92	6846,92	30.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В1-5	1	0	1242,2	0	30.06.2004	
Внутренние стеновые панели В2-1	1	1	1145,3	1145,3	10.07.2004	
Внутренние стеновые панели В2-4*1	34	34	19288,88	19288,88	05.06.2004	
Внутренние стеновые панели В2-7	17	17	8013,46	8013,46	11.07.2004	
Внутренние стеновые панели В3-1-1	51	51	32066,25	32066,25	30.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В4	18	18	8775,36	8775,36	18.06.2004	06.04.2004
Внутренние стеновые панели В4-1	17	17	7331,08	7331,08	12.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-2	3	3	1459,35	1459,35	20.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-2-1	16	16	6378,72	6378,72	30.06.2004	
Внутренние стеновые панели В4-3	34	0	9662,8	0	16.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-1	36	0	13364,8	0	12.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-2	2	0	1134,8	0	03.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-2-1	85	65	26829,4	20516,6	27.06.2004	
Внутренние стеновые панели В5-6						
Внутренние стеновые панели В6-1						

**Номенклатура, количество, стоимость (план / факт)**

-  План поставок
-  Прайс-листы
-  Спецификации
-  Заказ MTP
-  Контроль поставок
-  Складская логистика
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

## Контроль поставок MTP на объекты строительства

Оборудование	Количество		Стоимость		Срок передачи под монтаж	
	Заказано	Отгружено	Заказано	Отгружено	План	Факт
Объект : Жилой комплекс № 1						
Тип оборудования : Блоки стеновые						
Блоки стеновые ФБС 9.4.6-т	5	5	1539,1	1539,1	17.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.4.6-т	7	7	2926,77	2926,77	25.06.2004	06.04.2004
Блоки стеновые ФБС 9.3.6-т	33	23	7605,18	5300,58	05.06.2004	
Блоки стеновые ФБС 12.3.6-т	21	21	4191,18	4191,18	10.07.2004	06.04.2004
Тип оборудования : Внутренние стеновые панели						

### 4. Управление поставками - Исполнение договоров MTP

AD43

**Исполнение обязательств по договорам на поставку материально-технических ресурсов по состоянию на 13.07.2004**


Объекты / Контрагенты	Договор № / дата	Спецификация к договору	Дата подготовки	Плановые сроки поставок		Стоимость поставки	Поставка MTP на тек. дату		Оплата поставщикам							
				Начало	Окончание		Всего	Остаток	Всего	Остаток	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Микрорайон №1</b>																
<b>1. Жилищное строительство</b>																
<b>Жилой комплекс № 1</b>																
<b>Монтажстеноб</b>																
35-27/16 от 14.01.2004 от 14.01.2004 Новый этап																
		Спецификация 2	02.04.2004	01.04.2004	22.06.2004	2 134,00	1 534,00	600,00	1 250,00	884,00	41%					
		Спецификация 3	13.04.2004	29.04.2004	29.06.2004											
<b>Спецнабтехкомплект</b>																
26/12-08 от 12.01.2004 от 12.01.2004																
			test1	04.04.2004			30 079,38	16 470,00	13 609,38			30 079,38				

# Контроль исполнения планов строительства

ГОДОВОЙ ПЛАН

Заказчик

Договоры




Контроль поставок МТР на объекты

Контроль производства работ на объектах

Контроль финансирования строительства

Контроль показателей годового плана



Ввод объектов

Генподрядчик

Поставка МТР на объекты строительства

Выполнение работ по договорам подряда

Потребности в финансировании работ и поставок

Поставщики

Поставка МТР на объекты строительства

Потребности в финансировании поставок МТР



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль


**Годовой план**

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
<b>Местонахождение объекта : Микрорайон №1</b>						
<b>Тип объекта : 1.Жилищное строительство</b>						
Жилой комплекс № 1	1 142,72	318,86	15,67	15,79	18,98	50,43
Жилой комплекс № 2	1 028,44	286,98	14,10	14,21	17,08	45,39
Жилой комплекс № 5	1 371,26	382,64	18,80	18,94	22,78	60,52
<b>Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры</b>						
Сервисный автоцентр	342,81	95,66	4,70	4,74	5,69	15,13
Спортивно-оздоровительный центр	314,25	87,69	4,31	4,34	5,22	13,87
Торгово-развлекательный центр №1	799,90	223,21	10,97	11,05	13,29	35,30
<b>Тип объекта : 3.Объекты социальной сферы</b>						
Детский сад №1	57,14	15,94	0,78	0,79	0,95	2,52
Детский сад №2	59,99	16,74	0,82	0,83	1,00	2,65
<b>Итого</b>	<b>199,98</b>	<b>55,80</b>	<b>2,74</b>	<b>2,76</b>	<b>3,32</b>	<b>8,83</b>

**План строительства по кварталам и месяцам 2005 г.**


План капитальных вложений 2004    План финансирования 2004

Структура годового плана



- 1.Жилищное строительство 988,481
- 2.Объекты инфраструктуры 406,553
- 3.Объекты социальной сферы 145,881
- 4.Дорожное строительство 40,655
- 5.Инженерные объекты 83,702

План капитальных вложений 2004

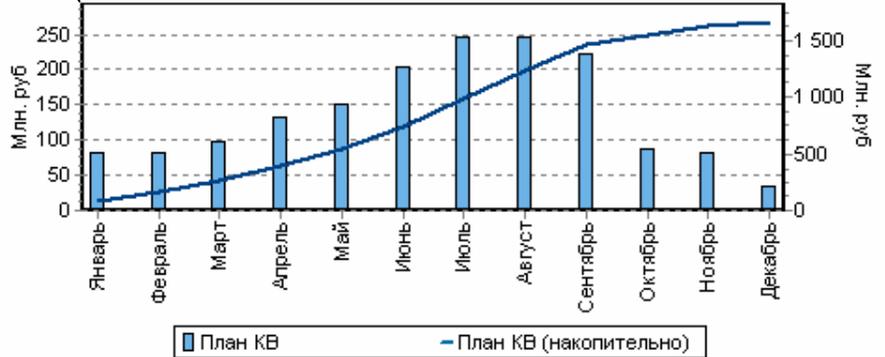



Титульные списки

Договорное обеспечение

Проектирование

Производство

Учет и контроль

**Типы договоров**

Аналитика и отчетность

Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
Тип объекта : 1.Жилищное строительство						
Жилой комплекс № 1	1 142,72	318,86	15,67	15,79	18,98	50,43
Жилой комплекс № 2	1 028,44	286,98	14,10	14,21	17,08	45,39
Жилой комплекс № 5	1 371,26	382,64	18,80	18,94	22,78	60,52
		87,69	4,31	4,34	5,22	13,87

**Реестр договоров по объекту строительства:**

**Объекты**

Наименование: Жилой комплекс № 1 ID Объекта: 1234.3.04.01 Сроки строительства: Начало 01.01.2004, Конец 31.12.2006

Местонахождение: Микрорайон №1 Тип объекта: 1.Жилищное строительство

Проектировщик: Гипростройпроект Генподрядчик: Промспецстрой

План капитальных вложений | Годовой план | Финансирование | **Договорное обеспечение** | Дополнительно | Контроль

Тип договора	Исполнитель	№ договора	Дата подписания	Сумма договора	Статус договора
Договор поставки	Монтажстройснаб	35-27/16 от 14.01.2004	14.01.2004	0,00р.	Договор подписан
Договор поставки	Спецснабтехкомлект	26/12-08 от 12.01.2004	12.01.2004	0,00р.	Договор подписан
Договор подряда	Промспецстрой	12/65-09	01.01.2004	83 955 600,00р.	Договор подписан
Договор ПИР	Гипростройпроект	12/23-34	01.03.2004	1 451 160,00р.	Договор подписан
Договор авторского надзора	Гипростройпроект	10/41-15	01.03.2004	250 300,00р.	Договор подписан

Обновить план

Закрывать

OK Отмена

**Исполнители:**

- поставщики
- проектировщики
- подрядчики
- прочие организации



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль

- Аналитика и отчетность
- Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				
		Всего	Январь	Февраль	Март	Итого I кв.

- Местонахождение объекта : Микрорайон №1
- Тип объекта : Жилой компл
- Тип объекта : Жилой компл
- Тип объекта : Жилой компл
- Тип объекта : Спортивно-оз
- Тип объекта : Строительство
- Тип объекта : Торгово-разв
- Тип объекта : Детский сад
- Тип объекта : Детский сад
- Тип объекта : Поликлиника
- (Итого I кв.)

**Договор подряда на СМР( Приобретение )**


Тип договора	№ документа	Дата подписания договора
Договор подряда на СМР	12/65-09	01.01.2004
Исполнитель	ИНН исполнителя	Банк исполнителя
Промспецстрой	1589429089	банк
Заказчик	ИНН заказчика	Банк заказчика
Субъект 1	1223785401	Банк

Этапы договора    Дополнительно    История

№	Наименование	Дата начал	Дата оконч	Сумма
1	Подготовка территории строительства	04.01.2004	23.01.2004	15 669 029,40р.
2	Временные здания и сооружения (подготовительный период)	06.01.2004	20.02.2004	0,00р.
3	Основные объекты строительства	01.01.2004	22.12.2004	210 959 113,00р.
4	Объекты энергетического хозяйства	03.07.2004	28.07.2004	46 891 874,80р.
5	Объекты транспортного хозяйства и связи	25.06.2004	27.06.2004	38 885 945,00р.
6	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, т	03.12.2004	14.12.2004	6 458 786,40р.
7	Благоустройство и озеленение	15.06.2004	10.08.2004	0,00р.
				1 142 775 599,60

**Основные этапы договора**

**Сроки и стоимость этапов**




# Работы



▼ Макет: Ввод плановых данных

Фильтр: Все работы

ID работы	Название работы
<b>Жилой комплекс: № 1</b>	
<b>Подготовка территории строительства</b>	
SMP1110	Вырубка деревьев
SMP1120	Вертикальная планировка
SMP1130	Устройство ограждения
Снос строений, разборка пр, отвод участка	
Геодезия	
Перекладка инженерных сетей из пятна застройки	
Очистка территории от деревьев и кустарников	
Прочее	
<b>Основные объекты строительства</b>	
Земляные работы	
SMP1160	Уст-во котлована
Фундаменты	
SMP 1170	Устр-во основания и монолитной плиты
Подземная часть	
SMP2080	Монтаж цокольного этажа
Входы	
SMP2090	Устр-во входов
Перегородки	
Надземная часть	
Внутренний каркас	
SMP2390	Монтаж 1-го этажа

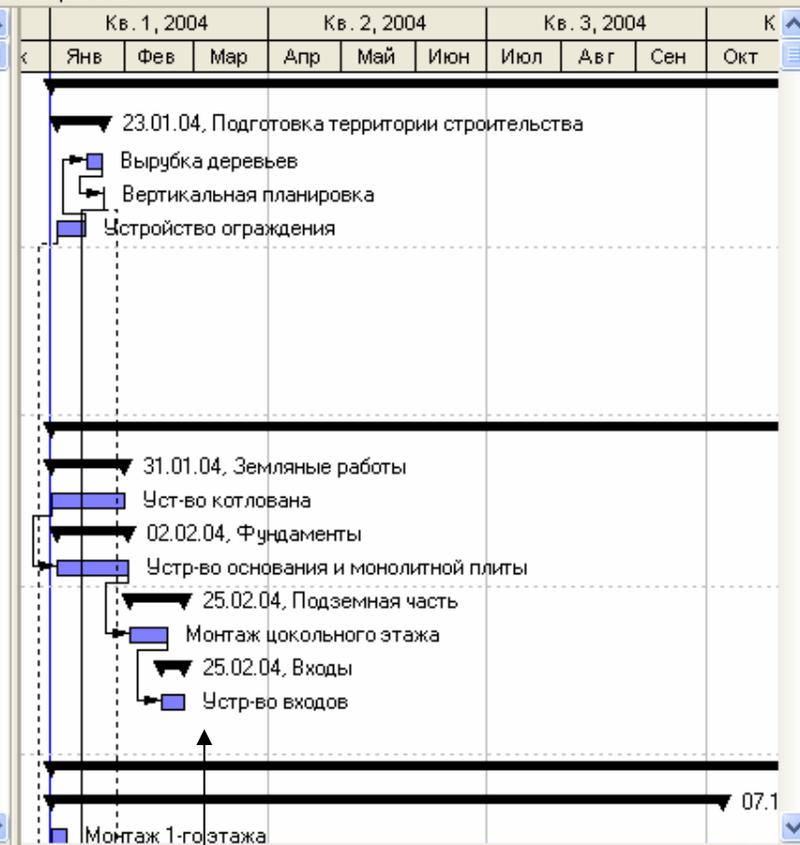

Новый

Удалить

Вырезать

Копировать

Вставить

Ресурсы

Рес. по роли

Роли

Коды работ

Предшествен...

Последователи

Общее	Статус	Ресурсы	Коды	Заметки	Шаги	Документы	Расходы	Последователи	Предшественники	Зависимости
Работа										Проект
Статья затрат										

**Календарно-сетевой график**



**Ввод актов  
выполненных работ  
по договорам подряда**

- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

**Выбор  
выполненных  
работ из WBS**

**Структура декомпозиции  
работ (WBS)**

**Справочник**

- Основные объекты строительства
  - Электромонтажные работы
    - Сети
    - Оборудование
  - Лифты
    - Наладка оборудования
    - Поставка оборудования
    - Монтаж оборудования
  - Сантехнические работы
    - Вентиляция и кондиционирс
    - Отопление
    - Газоснабжение
    - Водопровод
    - Канализация
  - Подземная часть
    - Входы
    - Перегородки

ID раб	Наименован	Дл	Нач. дата	Кон. дата	%
СМР1910	Монтаж дисп. инж. обор.	49	01.04.2004	20.05.2004	
СМР1920	Монт. линии радиотрансляции	80	01.03.2004	20.05.2004	
СМР1930	Монтаж автоматики, дымоудаления	49	01.04.2004	20.05.2004	
СМР1940	Монтаж системы охраны входов	54	01.04.2004	25.05.2004	
СМР1950	Устр-во ОЗДС	49	01.04.2004	20.05.2004	
СМР1960	Монтаж тел. кабеля	80	21.05.2004	09.08.2004	
СМР1970	Монтаж телевизионного кабеля	97	21.05.2004	26.08.2004	

ID ресурс	Наименование работ	План. кол-во	План. ст-ть	Факт. кол-во за мц	Факт. ст-ть за мц
	Монт. линии радиотрансляции	0	0,00р.		
	Монтаж автоматики, дымоудалени	0	0,00р.		
	Монтаж дисп. инж. обор.	0	0,00р.		
	Монтаж системы охраны входов	0	0,00р.		

OK Отмена

План капитальных вложений (млн.руб.)

Март Итого I кв.

Просмотр

НДС

НДС 18 % кроме того

↑ ↓ Выбрать

0,00

OK Отмена

Проект/ Оформлен



**Ввод актов  
выполненных работ  
по договорам подряда**

- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Заполненная фактурная часть документа
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				Итого I кв.
		Всего	Январь	Февраль	Март	
Местонахождение объекта: Микрорайон №1						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип объекта: Жилой комплекс</li> <li>- Тип объекта: Жилой комплекс</li> <li>- Тип объекта: Жилой комплекс</li> <li>- Тип объекта: Спортивно-оздоровительное строительство</li> <li>- Тип объекта: Торгово-развлекательное строительство</li> <li>- Тип объекта: Детский сад №1</li> <li>- Тип объекта: Детский сад №2</li> <li>- Тип объекта: Поликлиника №1</li> </ul>						

**Справка КС**

Номер: a2      Дата: 09.07.2004

Документ-основание: 12/65-09 от 30.06.2004 Основные объекты строительства Просмотр

Объект внедрения: Жилой комплекс № 1

Исполнитель: Промспецстрой

Заказчик: Субъект 1

Реестр выполненных работ

ID рабс	Наименование	ID ресурса	План ст-ть	НДС
CMP1920	Монт. линии радиотрансляции			НДС 18 % кроме то
CMP1930	Монтаж автоматики. дымоудаления			НДС 18 % кроме то
CMP1930	Монтаж автоматики. дымоудаления			НДС 18 % кроме то
CMP1940	Монтаж системы охраны входов			НДС 18 % кроме то
CMP1950	Устр-во ОЗДС			НДС 18 % кроме то
CMP1960	Монтаж тел. кабеля			НДС 18 % кроме то
CMP1960	Монтаж тел. кабеля			НДС 18 % кроме то

Итого

Итого по документу **0,00р.** в т.ч. НДС **0,00р.**      Оплачено на сумму **0,00**

OK     Отмена



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Приход от поставщиков - Печатная форма КС-2

75%

**B I U G** [List of icons]

174

№	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	И
2							Унифицированная форма N КС-2	
3							Утверждена Постановлением Госкомстата России	
4							от 11 ноября 1999 г. N 100	
5							КОД	
6							Форма по ОКУД	322005
7							Форма по ОКПО	
8	Инвестор						по ОКПО	
9								
10								
11	Заказчик	Субъект 1					по ОКПО	
12	(Генподрядчик)							
13								
14	Подрядчик	Промспецстрой					по ОКПО	
15	(Субподрядчик)							
16								
17	Стройка							
18								
19	Объект	Жилой комплекс № 1						
20								
21	Вид деятельности						по ОКДП	
22								
23	Договор подряда (контракт)						Номер	12/65-09
24							Дата	01.01.2004
25								
26							вид операции	
27								
28								
29							Дата составления	Отчетный период
30								с по
31							09.07.2004	01.06.2004 30.06.2004
32								
33								

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№	Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
	по порядку	позиции по				количество	цена за единицу	стоимость
	1	2		4	5	6	7	8
36	1		Монт. линии радиосвязи		м.	2,00	44,00	88,00
37	2		Монтаж автоматики. дымоудаления		шт.	2,00	44,00	88,00
38								



**Ввод актов  
выполненных работ  
по договорам подряда**

- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Годовой план

Объект строительства	Стоимость объекта	План капитальных вложений (млн.руб.)				Итого I кв.
		Всего	Январь	Февраль	Март	
Местонахождение объекта : Микрорайон №1						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип объекта : Жилой компл...</li> <li>- Тип объекта : Жилой компл...</li> <li>- Тип объекта : Жилой компл...</li> <li>- Тип объекта : Спортивно-озд...</li> <li>- Тип объекта : Строительство</li> <li>- Тип объекта : Торгово-разви...</li> <li>- Тип объекта : Детский сад №...</li> <li>- Тип объекта : Детский сад №...</li> <li>- Тип объекта : Поликлиника №...</li> </ul>						

**Справка КС**

Номер: a2      Дата: 09.07.2004

Документ-основание: 12/65-09 от 30.06.2004 Основные объекты строительства

Объект внедрения: Жилой комплекс № 1

Исполнитель: Промспецстрой

Заказчик: Субъект

**Справка КС- 3**

Номер: КС-3      Дата: 08.04.2004

Документ-основание: 12/65-09 от 01.01.2004 Подготовка территории

Объект внедрения: Жилой комплекс № 1

Исполнитель: Промспецстрой

Заказчик: Субъект 1

Реестр выполненных работ			Кол-во	Ед.из.	Сумма
ID рабс	Наименование				
SMP1920	Монтаж		1	шт	210 300,00р.
SMP1930	Монтаж				
SMP1930	Монтаж				
SMP1940	Монтаж				
SMP1950	Устр-во				
SMP1960	Монтаж				
SMP1960	Монтаж				
<b>Итого</b>					
<b>Итого по документу</b>					



- Титульные списки
- Договорное обеспечение
- Проектирование
- Производство
- Учет и контроль
- Аналитика и отчетность
- Настройки

Приход от поставщиков - Печатная форма КС-3

75%

**B I U G** [List of icons]

G31

	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3						Унифицированная форма N КС-3
4						Утверждена Постановлением Госкомстата России
5						от 11 ноября 1999 г. N 100
6						КОД
7					Форма по ОКУД	322005
8					по ОКПО	
9	Инвестор	_____			по ОКПО	
10		(организация, адрес, телефон, факс)				
11	Заказчик	Субъект 1			по ОКПО	
12	(Генподрядчик)	_____				
13		(организация, адрес, телефон, факс)				
14	Подрядчик	Промспецстрой			по ОКПО	
15	(Субподрядчик)	_____				
16		(организация, адрес, телефон, факс)				
17	Стройка	_____				
18		(наименование, адрес)				
19	Объект	Жилой комплекс № 1				
20		_____				
21		(наименование)				
22	Вид деятельности				по ОКДП	
23	Договор подряда (контракт)				Номер	12/65-09
24					Дата	01.01.2004
25						
26					вид операции	
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
КС-3	08.04.2004	01.03.2004	31.03.2004

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6



-  Титульные списки
-  Договорное обеспечение
-  Проектирование
-  Производство
-  Учет и контроль
-  Аналитика и отчетность
-  Настройки

**Справка КС 3** **Реестр актов выполненных работ**

Договор основание	Вид	№ Акта	Объект	Сумма по док-ту	Дата
<b>Исполнитель : СМУ №128</b>					
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-апр	Строительство сервисного автоцентра	53 661,94р.	08.04.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-апр	Строительство сервисного автоцентра	26 511,35р.	08.04.2004
<b>Исполнитель : Промспецстрой</b>					
12/65-09 от 01.01.2004 Подготовка территории строительства	Справка КС 3	а2	Жилой комплекс № 1	10 300,0р.	09.07.2004
<b>Исполнитель : Подрядная Организация 3</b>					
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-004	Поликлиника №1	450 160,00р.	17.02.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-006	Поликлиника №2	748 400,00р.	17.02.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-002	Школа №68	706 200,00р.	17.02.2004
<b>Исполнитель : Подрядная Организация 2</b>					
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-019	Жилой комплекс № 1	6 334 288,00р.	17.02.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-022	Жилой комплекс № 1	34 765 428,20р.	17.03.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-03-012	Торгово-развлекательный центр №1	2 975 000,00р.	17.02.2004
12/100-09 от 01.01.2004 Новый этап	Справка КС 3	КС-008	Торгово-развлекательный центр №1	2 750 000,00р.	17.02.2004

Закрыто



**Платежный календарь**

График финансирования

Платежный календарь

Учет и контроль

Взаиморасчеты

Договорное обеспечение

**Платежный календарь**

Тип документа	Дата документа	Сумма документа	Оплачено	Задолженность	Приори	Платеж
Тип договора : Договор подряда						
+ Контрагент : Организация Поставщик 1						
+ Контрагент : Организация Поставщик 2						
- Контрагент : Подрядная Организация 2						
- №/дата договора : ДГ СМР-0003 от 28.01.2004						
Справка КС-3	17.02.2004	1 309 760,00р.	0,00р.	1 309 760,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Справка КС-3	17.02.2004	1 293 190,00р.	0,00р.	1 293 190,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Счет	18.02.2004	369 036,00р.	0,00р.	369 036,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Счет	18.02.2004	5 102 477,50р.	0,00р.	5 102 477,50р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Счет	18.02.2004	360 945,00р.	0,00р.	360 945,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Счет	18.02.2004	0,00р.	0,00р.	0,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
		<b>8 435 408,50р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>8 435 408,50р.</b>		<b>0,00р.</b>
- №/дата договора : ДГ-341_03 от 01.09.2003						
Справка КС-3	17.02.2004	2 975 000,00р.	0,00р.	2 975 000,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Справка КС-3	17.02.2004	2 750 000,00р.	0,00р.	2 750 000,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
		<b>5 725 000,00р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>5 725 000,00р.</b>		<b>0,00р.</b>
		<b>14 160 408,50р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>14 160 408,50р.</b>		<b>0,00р.</b>
+ Контрагент : Подрядная Организация 3						
+ Контрагент : Промспецстрой						
		<b>253 252 795,66р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>253 252 795,66р.</b>		<b>0,00р.</b>

**Реестр документов к оплате**

Аналитика и отчетность

Настройки

**Сумма текущей задолженности**

Остаток средств на р/с 10 514 234,00р.

Лимит финансирования 6 734 524,00р.

**Остатки на р/с**

**Текущий лимит финансирования**



**Платежный календарь**

График финансирования

Платежный календарь

Учет и контроль

Взаиморасчеты

Договорное обеспечение

**Платежный календарь**

Тип документа | Дата документа | Сумма документа | Оплачено | Задолженность | Приори | Платеж

Тип договора : Договор подряда						
+ Контрагент : Организация Поставщик 1						
+ Контрагент : Организация Поставщик 2						
- Контрагент : Подрядная Организация 2						
Nº/дата договора : ДГ СМР-0003 от 28.01.2004						
Справка КС-3	17.02.2004	1 309 760,00р.	0,00р.	1 309 760,00р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	1 309 760,00р.
Справка КС-3	17.02.2004	1 293 190,00р.	0,00р.	1 293 190,00р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	1 293 190,00р.
Счет	18.02.2004	369 036,00р.	0,00р.	369 036,00р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	369 036,00р.
Счет	18.02.2004	5 102 477,50р.	0,00р.	5 102 477,50р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	5 102 477,50р.
Счет	18.02.2004	360 945,00р.	0,00р.	360 945,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
Счет	18.02.2004	0,00р.	0,00р.	0,00р.	<input checked="" type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да	0,00р.
		<b>8 435 408,50р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>8 435 408,50р.</b>		<b>8 074 463,50р.</b>
Nº/дата договора : ДГ-341_03 от 01.09.2003						
Справка КС-3	17.02.2004	2 975 000,00р.	0,00р.	2 975 000,00р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	2 975 000,00р.
Справка КС-3	17.02.2004	2 750 000,00р.	0,00р.	2 750 000,00р.	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да	0,00р.
		<b>5 725 000,00р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>5 725 000,00р.</b>		<b>2 975 000,00р.</b>
		<b>14 160 408,50р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>14 160 408,50р.</b>		<b>11 049 463,50р.</b>
+ Контрагент : Подрядная Организация 3						
+ Контрагент : Промспецстрой						
		<b>253 252 795,66р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>253 252 795,66р.</b>		<b>11 049 463,50р.</b>

**Определение приоритетных платежей**

**Сумма к оплате**

**Реестр документов к оплате**

Аналитика и отчетность

Настройки

Оплатить

Остаток средств на р/с 10 514 234,00р.

Лимит финансирования 6 734 524,00р.

Текущий лимит превышен:

OK Отмена



C:\Program Files\1Cv77\1SBDemo\ExtForms\Загрузка пер...

Загрузка данных ПМС

Имя файла с данными ПМС

d:\temp\DataIn.DBF

Выгрузка информации о платежах

Дата начала: 01.01.04    Дата окончания: 01.01.05

Имя файла для выгрузки данных в ПМС

d:\temp\DataOut.DBF

Загрузить    Выгрузить    Закрыть


Справо...

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер

**Экспорт данных  
в 1С: Бухгалтерия**



Справочник: Первичные Документы из PMS



Номер	Дата	Контрагент	Договор Основание	Сумма	СуммаБНДС	СуммаНДС
Д9	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	957600.00	798000.00	159600.00
Док-01	09.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004			
Док-05	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	708000.00	590000.00	118000.00
Док-09	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	1500000.00	1250000.00	250000.00
Док-15	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	2028000.00	1690000.00	338000.00
Док-2	12.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004			
Док-24	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	2700000.00	2250000.00	450000.00
Док-56	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	1860000.00	1550000.00	310000.00
Док-7	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	1804000.00	1520000.00	284000.00
Док-9	12.07.04	Подрядная Организация 1	test от 12.07.2004	481.44	408.00	73.44
Док-98	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	15780000.00	13150000.00	2630000.00
Док4	12.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004	180.00		180.00
КС-002	17.02.04	Подрядная Организация 3	12/100-09 от 30.06.2004	706200.00	706200.00	
КС-004	17.02.04	Подрядная Организация 3	12/100-09 от 30.06.2004	450160.00	450160.00	
КС-006	17.02.04	Подрядная Организация 3	12/100-09 от 30.06.2004	748400.00	748400.00	
КС-008	17.02.04	Подрядная Организация 2	12/100-09 от 30.06.2004	2750000.00	2750000.00	
КС-009	05.01.04	Организация Поставщик 2	12/100-09 от 30.06.2004	9334740.92	9334740.92	
КС-019	17.02.04	Подрядная Организация 2	12/100-09 от 30.06.2004	6334288.00	6334288.00	
КС-022	17.03.04	Подрядная Организация 2	12/100-09 от 30.06.2004	34765428.20	34765428.20	
КС-03-012	17.02.04	Подрядная Организация 2	12/100-09 от 30.06.2004	2975000.00	2975000.00	

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер

Экспорт данных в 1С: Бухгалтерия



Номер	Дата	Контрагент	Договор Основание
133-0	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
134-3	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
145	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
2-12	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
8	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Д-10	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Д9	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-01	09.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004
Док-05	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-09	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-15	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-2	12.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004
Док-24	07.04.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-56	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-7	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док-9	12.07.04	Подрядная Организация 1	test от 12.07.2004
Док-98	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004
Док4	12.07.04	Промспецстрой	12/65-09 от 30.06.2004
КС-002	17.02.04	Подрядная Организация 3	12/100-09 от 30.06.2004
КС-004	17.02.04	Подрядная Организация 3	12/100-09 от 30.06.2004

Первичные Документы из PMS:133-0 от 07...

133-0 от 07.02.04 по дог

Состояние: **Оформлен**

Тип Документа: Справка КС 3

Идентификатор документа в PMS: 58943

Номер: 133-0

Дата: 07.02.04

Контрагент: Организация Поставщик 1

Договор Основание: 12/100-09 от 30.06.2004

Всего по документу: 15216000.00

Всего без НДС: 12700000.00

Всего НДС: 2516000.00

Закреть Провести ОК

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер

Экспорт данных в 1С: Бухгалтерия



Журнал операций (01.01.04-31.12.04)

Дата	Время	Документ	Номер	Содержание	Сумма
07.02.04	12:00:00	<Операция>	133-0	Приемка строительно-монтажных работ.	15,216,000.00
13.07.04	13:07:18	Счет-фактура по	1	Сч.-факт. поставщика: Организация Пост.	
13.07.04	18:32:28	Платежное пору	00000001	Платежное поручение	15,216,000.00

Печать Ввести документ Ввести типовую операцию Ввести операцию вручную Сторно

№	Дебет	СубконтоДт	Кредит	СубконтоКт	Вал. Курс	Кол-во	Вал.с...	Сумма
1	08.3	Жилой Комплек Строительно-м 133-0 от 07.02.0	60.1	Организация П 12/65-09 133-0 от 07.02.0				12,680,000.00
2	19.1	Организация П Счет-фактура п	60.1	Организация П 12/65-09 133-0 от 07.02.0				2,536,000.00

Состояние: **Оформлен**

авка КС 3

58943

1

04

низация Поставщик 1

00-09 от 30.06.2004

Всего без НДС

12700000.00

Всего НДС

2516000.00

Провести OK

**Бухгалтерские проводки в 1С**  
(документ-основание: из PMFinance)

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер



Справочник: Первичные Документы из PMS



Номер	Дата	Контрагент	Договор Основание	Сумма	СуммаБНДС	СуммаНДС
133-0	07.02.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	15216000.00	12700000.00	2516000.00
134-3	07.01.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	16454400.00	13732000.00	2722400.00
145	07.03.04	Организация Поставщик 1	12/100-09 от 30.06.2004	19632000.00	16360000.00	3272000.00

Платежные документы (01.01.04-31.12.04)



Дата	Документ	№	Дата выписки	Сумма	Контрагент
13.07.04	Платежное поручение	00000001		15,216,000.00	Организация Поставщик 1
13.07.04	Платежное поручение	00000002	13.07.04	15,216,000.00	Организация Поставщик 1

Р/с № 40702810500000000010 в банке: Главный банк

Комментарий:

Закреть Действия... Реестр 1С:Предприятие - Клиент банка

20920000.00	4184000.00
25300000.00	5060000.00
12150000.00	2430000.00
7980000.00	1596000.00
590000.00	118000.00
1250000.00	250000.00
1690000.00	338000.00
2250000.00	450000.00
1550000.00	310000.00
1520000.00	284000.00
408.00	73.44
13150000.00	2630000.00
	180.00
706200.00	
450160.00	

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер

**Подготовка платежных поручений в 1С: Бухгалтерия**



Номер	Дата
133-0	07.02.04
134-3	07.01.04
145	07.03.04

Платежные документы (01.01.04)

Дата	Документ
13.07.04	Платежное поручение
13.07.04	Платежное поручение

P/c № 40702810500000000010 в банке: Главн...  
Комментарий:

**Платежное поручение - 00000002 \***

P/c № 40702810500000000010 в Главный банк

Перечисление налога

**Платежное поручение №** 00000002 **от** 13.07.04

Получатель: Организация Поставщик 1 0 Сумма: 15,216,000.00

Счет получателя: Основной 0 Ставка НДС: Без налога (НДС)

Основание: 12/65-09 НДС: 0.00

Документ PMS: 133-0 от 07.02.04 по дог.

КПП получателя: X КПП плательщика: X

Назначение платежа: Электронно X По 12/65-09 X

Вид платежа: Автоподстановка в текст платежного поручения

Срок платежа: X Не указывать в тексте сумму и НДС

Очередность платежа: 6 X <Назначение платежа>

Комментарий:

Записать Печать OK Закрыть Действия... Перечисление налога

**суммаНДС**

2516000.00
2722400.00
3272000.00
4184000.00
5060000.00
2430000.00
159600.00
118000.00
250000.00
338000.00
450000.00
310000.00
284000.00
73.44
2630000.00
180.00

- Загружен документ с номером 8
- Загружен документ с номером Док-7
- Загружен документ с номером Док-56
- Загружен документ с номером Док-15
- Загружен документ с номером Док-24
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером КС-апр
- Загружен документ с номером Номер

**Подготовка платежных поручений в 1С: Бухгалтерия**


# Бюджетирование в проектно-ориентированной компании

- Формирование структуры статей бюджета
- Планирование показателей бюджета
- Оперативное бюджетное планирование по центрам финансовой ответственности
- Контроль исполнения бюджетов



-   
 Капитальные вложения
-   
 Договорное обеспечение
-   
 Производство
-   
 Финансы
-   
 Учет и контроль

**Статьи затрат**

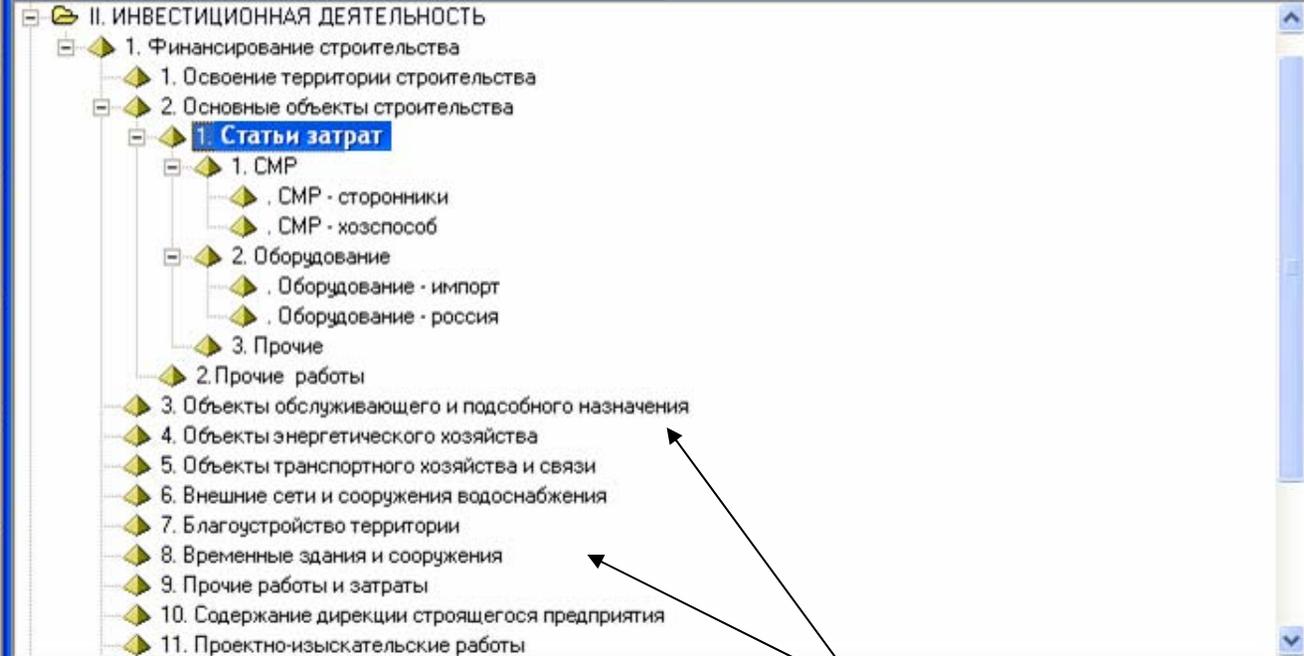

**Подготовка бюджета**

Общие данные

Верхний уровень  
 Основные объекты строительства

Код	Наименование
1	Поверхность

Объект  
 \_\_\_\_\_

Валюта  
 Рубль

**Формирование структуры статей бюджета компании:**

**I. Операционная деятельность**

**II. Инвестиционная деятельность**

**III. Финансовая деятельность**

OK Отмена



- Капитальные вложения
- Договорное обеспечение
- Производство
- Финансы
- Учет и контроль
- Отчеты

## Подготовка бюджета

### Объекты

Код	Б. 3	Объект	Жилой комплекс №1
Местонахождение	Микрорайон №1	Тип объекта	Жилищное строительство
Подрядчик		Заказчик	
Сроки	Начало: 01.01.2004	Окончание: 31.12.2006	Стоимость: 3 100 000,00
Инвестор		№ и дата ПСД	
Проектировщик	Гипростройпроект		

Договоры | Документы | Платежи | Дополнительно | **Бюджет**

Код	Наименование	Январь, 2005, ПНБ	Февраль, 2005, ПНБ	Март, 2005, ПНБ	Апрель, 2005, ПНБ	Май, 2005, ПНБ	Июнь, 2005, ПНБ	Июль, 2005, ПНБ
<b>Б. 3</b>	<b>Жилой комплекс №1</b>	4 720 000,00	7 410 000,00	5 500 000,00	11 133 000,00	8 400 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
<b>ОСВ</b>	<b>Освоение</b>	4 720 000,00	7 410 000,00	5 500 000,00	11 133 000,00	8 400 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
<b>ОСВ_СМ</b>	<b>СМР</b>	1 670 000,00	5 560 000,00	3 750 000,00	8 800 000,00	6 700 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
<b>ОСВ_СМ</b>	<b>СМР - сторонники</b>	1 170 000,00	3 400 000,00	2 100 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
<b>ОСВ_СМ</b>	<b>СМР - хозспособ</b>	500 000,00	2 160 000,00	1 650 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
<b>ОСВ_Обо</b>	<b>Оборудование</b>	2 450 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 533 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>ИМПОБО</b>	<b>Оборудование - импорт</b>	800 000,00	700 000,00	350 000,00	433 000,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>РОСОБО</b>	<b>Оборудование - россия</b>	1 650 000,00	600 000,00	650 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>ОСВ_Про</b>	<b>Прочие</b>	600 000,00	550 000,00	750 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Динамика показателей по статьям бюджета**  
 (рассчитана на основании календарно-сетевых графиков и планируемых схем финансирования)

Сроки: Начало 01.01.2005 | Окончание 31.12.2005 |  Суммировать

ОК     Отмена

- Капитальные вложения
- Договорное обеспечение
- Производство
- Финансы
- Учет и контроль
- Отчеты

## Подготовка бюджета

**Объекты**

Код: 6.3      Объект: Жилой комплекс №1

Местонахождение: Микрорайон №1      Тип объекта: Жилищное строительство

Подрядчик: \_\_\_\_\_      Заказчик: \_\_\_\_\_

Сроки: Начало: 01.01.2004      Окончание: 31.12.2006      Стоимость: 3 100 000,00

Инвестор: \_\_\_\_\_

Проектировщик: Гипростройпроект

Код	Наименование
6.3	Жилой комплекс №1
ОСВ	Освоение
ОСВ_СМ	СМР
ОСВ_СМ	СМР - сторонники
ОСВ_СМ	СМР - хозспособ
ОСВ_Обо	Оборудование
ИМПОБО	Оборудование - импорт
РОСОБО	Оборудование - россия
ОСВ_Про	Прочие

**Параметры**

Показатели

- План по начислению Бюджет(ПНБ)
- План по оплате бюджет(ПОБ)
- План по оплате оперативный(ПОО)
- Факт по начислению(ФН)
- Факт по оплате(ФО)
- План-Прогноз Начисление(ППН)
- План прогноз оплата(ППО)
- Фактическая Контрактация(ФК)

	Апрель, 2005, ПНБ	Май, 2005, ПНБ	Июнь, 2005, ПНБ	Июль, 2005, ПНБ
План по начислению Бюджет(ПНБ)	11 133 000,00	8 400 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
План по оплате бюджет(ПОБ)	11 133 000,00	8 400 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
План по оплате оперативный(ПОО)	8 800 000,00	6 700 000,00	8 660 000,00	8 700 000,00
Факт по начислению(ФН)	5 400 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Факт по оплате(ФО)	3 400 000,00	1 500 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
План-Прогноз Начисление(ППН)	1 533 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
План прогноз оплата(ППО)	433 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Фактическая Контрактация(ФК)	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Итого	600 000,00	550 000,00	750 000,00	800 000,00
Сумма	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	0,00	0,00	0,00	0,00

**Аналитические показатели бюджета:**

- План «по начислению»/ «по оплате»
- План «по контрактации» (на основании условий заключенных договоров)
- Оперативные планы
- Прогнозные показатели

Сроки: Начало: 01.01.2005      Окончание: 31.12.2005       Суммировать



# Оперативное бюджетное планирование

- Капитальные вложения
- Договорное обеспечение
- Производство
- Финансы
- Учет и контроль

## Оперативный бюджет

Период: 01.08.2005

Примечание:

Автор: Центр финансовой ответственности ОКС

Валюта: Рубль

**Центры финансовой ответственности**

Проект	Статья затрат	Контрагент	Договор	Документ	Валюта	К оплате	Зад
Признак : Документы с задолженностью							
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"	12-1/126-05/15п-05 от 01.02.2005	1 от 30.04.2005	Рубль	458 348,58	
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"	12-1/126-05/15п-05 от 01.02.2005	1 от 30.04.2005	Рубль	458 348,58	
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"	12-1/126-05/15п-05 от 01.02.2005	1 от 01.07.2005	Рубль	2 716 570,03	
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"	12-1/126-05/15п-05 от 01.02.2005	1 от 01.07.2005	Рубль	2 716 570,03	
Признак : Плановые платежи							
Жилой комплекс №1	Прочие	"Строитель"			Рубль	324 530,00	
Жилой комплекс №1	Оборудование - россия	Внеш Поставщик			Рубль	1 500 000,00	
Жилой комплекс №1	Прочие	СМУ-157			Рубль	340 550,00	
Жилой комплекс №1	Прочие	СМУ-98			Рубль	35 660,00	
Жилой комплекс №2	Прочие	ООО "ПромСтрой"			Рубль	5 500,00	
Жилой комплекс №2	Прочие	СМУ-98			Рубль	504 033,00	
Жилой комплекс №2	Прочие	СМУ-157			Рубль	340 000,00	
Жилой комплекс №2	Прочие	"Элт-Строй"			Рубль	70 044,00	
Жилой комплекс №2	Оборудование - импорт	ЗАО "Прокси"			Рубль	345 500,00	

**Формирование бюджетов на предстоящий период (квартал / месяц / декада)**

654,22

Провести + Добавить документ

**Показатели бюджета рассчитываются на основании прогнозного выполнения работ календарно-сетевым графика, принятого выполнения и задолженности по договорам**



# Оперативное бюджетное планирование

- Капитальные вложения
- Договорное обеспечение
- Производство
- Финансы
- Учет и контроль

**Оперативный бюджет**

Период: 01.08.2005

Примечание:

Проект	Статья затрат	Контрагент
Признак : Документы с задолженностью		
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"
Жилой комплекс №1	СМР - сторонники	ООО "ПромСтрой"
Признак : Плановые платежи		
Жилой комплекс №1	Прочие	"Строитель"
Жилой комплекс №1	Оборудование - россия	Внеш Поставщик
Жилой комплекс №1	Прочие	СМУ-157
Жилой комплекс №1	Прочие	СМУ-98
Жилой комплекс №2	Прочие	ООО "ПромСтрой"
Жилой комплекс №2	Прочие	СМУ-98
Жилой комплекс №2	Прочие	СМУ-157
Жилой комплекс №2	Прочие	"Элт-Строй"
Жилой комплекс №2	Оборудование - импорт	ЗАО "Прокси"

Центр финансовой ответственности  
ОКС

Автор: ЦФО

**Курсы валют**

Тип курса: Курс ЦБ      Дата: 13.07.2005

Валюта	Курс
Базовая валюта : Рубль	
EUR	34,56
Доллары США	28,34
Евро	34,56
Немецкая марка	20,23
Базовая валюта : Немецкая марка	
EUR	0,0
Доллары США	0,0
Евро	0,0
Рубль	0,0
Базовая валюта : Евро	
EUR	0,0
Доллары США	0,0
Немецкая марка	0,0
Рубль	0,0
Базовая валюта : Доллары США	
EUR	0,0
Евро	0,0
Немецкая марка	0,0
Рубль	0,0

## Планирование и контроль бюджетов в различных валютах

Сравнительный анализ показателей бюджетов по плановым, фактическим и прогнозным курсам валют

OK Отмена



# Контроль исполнения бюджетов

- Капитальные вложения
- Договорное обеспечение
- Производство
- Финансы
- Учет и контроль

**Объекты**

Код: 6.3  
 Местонахождение: Микрорайон №1  
 Подрядчик:  
 Сроки: Начало 01.01.2004, Окончание 31.12.2006  
 Инвестор:  
 Проектировщик: Гипростройпроект

Договоры | Документы | Платежи | Дополнительно | **Бюджет**

Код	Наименование	Январь, 2 ПНБ
6.3	Жилой комплекс №1	
ОСВ	Освоение	
ОСВ_СМ	СМР	
ОСВ_СМ	СМР - сторонники	1 170
ОСВ_СМ	СМР -хозспособ	500
ОСВ_Обо	Оборудование	
ИМПОБО	Оборудование - импорт	800
РОСОБО	Оборудование - россия	1 650
ОСВ_Про	Прочие	600
НЗС	Незавершенное строительство	
ОФ	Ввод основных фондов	

**Выберите отчет**

Наименование отчета

- + Категория отчета : 1. Капитальные вложения
- + Категория отчета : 2. Договорное обеспечение
- + Категория отчета : 3. Управление финансами
- + Категория отчета : 4. Управление поставками
- + Категория отчета : 5. Складская логистика
- + Категория отчета : 6. Аналитическая отчетность
- + Категория отчета : 7. Прочие
- Категория отчета : 8. Бюджетирование
  - Анализ финансирования инвестиционных проектов
  - Бюджет Движения Денежных средств
  - Бюджет Доходов и Расходов
  - График платежей
  - Ежемесячный отчет по финансированию инвестиционных проектов
  - Оперативный бюджет
  - План финансирования
  - Сравнительный баланс

OK Отмена

**Формирование аналитической отчетности по исполнению бюджета**

**Сравнительный анализ показателей бюджетов (план по утвержденному бюджету / план по контрактации / фактические и прогнозные показатели бюджетов)**


- Отчеты

# Оперативное планирование

ГОДОВОЙ ПЛАН

Дирекция


Договоры



Анализ плановых и фактических сроков выполнения работ

Пересчет календарно-сетевого графика

Пересчет графика финансирования



Подрядчики

Выполнение работ по договорам

Прогнозные сроки выполнения работ по договорам

Поставщики

Прогнозные сроки поставок по договорам



**График финансирования**

**Платежный календарь**

**Учет и контроль**



**Взаиморасчеты**

**Оперативное планирование**

Показатель	Стоимость объекта	Факт	%	Остаток	2 кв.	Апрель	Май	Июнь	3 кв.
					Местонахождение : Микрорайон №1				
Тип объекта : 1.Жилищное строительство									
Объект : Жилой комплекс № 1									
Выполнение	1142,7	50,4	4,4	1092,3	93,1	25,5	28,7	38,9	136,3
Финансирование	1142,7	5,8	0,5	1136,9	67,3	18,2	25,3	23,8	121,1
Объект : Жилой комплекс № 2									
Выполнение	1028,4	74,9	7,3	953,6	83,8	23,0	25,9	35,0	122,7
Финансирование	1028,4	0,0	0,0	1028,4	43,0	28,7	5,7	8,6	60,3
Объект : Жилой комплекс № 5									
Выполнение	1371,3	81,7	6,0	1289,6	111,7	30,6	34,5	46,7	163,6
Финансирование	1371,3	0,0	0,0	1371,3	57,4	38,3	7,7	11,5	80,4
Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры									

**План выполнения работ  
(в соответствии с календарно-сетевым графиком строительства)**

**План финансирования строительства  
(в соответствии с выбранной схемой финансирования по договорам)**

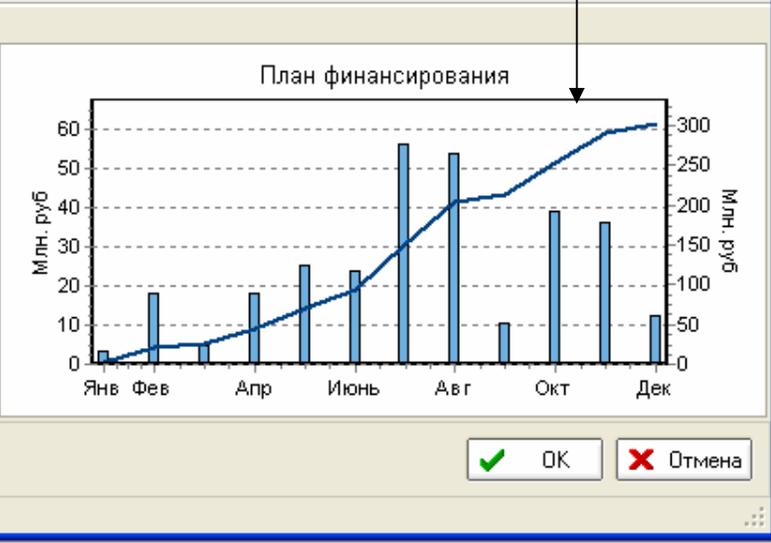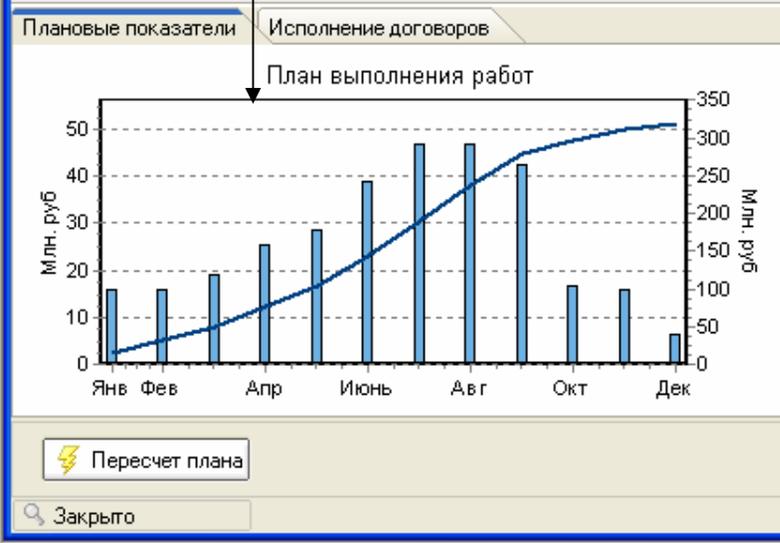

**Аналитика и отчетность**

**Настройки**

⚡ Пересчет плана

✓ ОК | ✗ Отмена

🔍 Зкрыто



**Фактические показатели**

**Оперативное планирование**

Показатель	Стоимость объекта	Факт	%	Остаток	2 кв.	Апрель	Май	Июнь	3 кв.
Местонахождение : Микрорайон №1									
Тип объекта : 1.Жилищное строительство									
Объект : Жилой комплекс № 1									
Выполнение	1142,0	50,4	4,4	1092,3	93,1	25,5	28,7	38,9	136,3
Финансирование	1142,0	5,8	0,5	1136,9	67,3	18,2	25,3	23,8	121,1
Объект : Жилой комплекс № 2									
Выполнение	1028,0	74,9	7,3	953,6	83,8	23,0	25,9	35,0	122,7
Финансирование	1028,0	0,0	0,0	1028,4	43,0	28,7	5,7	8,6	60,3
Объект : Жилой комплекс № 5									
Выполнение	1371,0	81,7	6,0	1289,6	111,7	30,6	34,5	46,7	163,6
Финансирование	1371,0	0,0	0,0	1371,3	57,4	38,3	7,7	11,5	80,4

- График финансирования
- Платежный календарь
- Учет и контроль
- Взаиморасчеты

**План выполнения работ**  
(в соответствии с календарно-сетевым графиком строительства)

**План финансирования строительства**  
(в соответствии с выбранной схемой финансирования по договорам)



**Пересчет плана**

OK Отмена

**Пересчет плана на основании фактических данных по выполнению и финансированию**



Пересчитанный текущий план

**Оперативное планирование**



Показатель	Стоимость объекта	Факт	%	Остаток	2 кв.	Апрель	Май	Июнь	3 кв.
Местонахождение : Микрорайон №1									
Тип объекта : 1.Жилищное строительство									
Объект : Жилой комплекс № 1									
Выполнение	1142,0	50,4	4,4	1092,3	62,6	25,5	9,7	27,4	126,5
Финансирование	1142,0	5,8	0,5	1136,9	69,4	6,4	32,4	30,7	123,9
Объект : Жилой комплекс № 2									
Выполнение	1028,0	74,9	7,3	953,6	83,8	23,0	25,9	35,0	122,7
Финансирование	1028,0	0,0	0,0	1028,4	43,0	28,7	5,7	8,6	60,3
Объект : Жилой комплекс № 5									
Выполнение	1371,0	81,7	6,0	1289,6	111,7	30,6	34,5	46,7	163,6
Финансирование	1371,0	0,0	0,0	1371,3					
Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры									

Фактические показатели

(1 кв. is greater than 0)

Customize...

Плановые показатели | **Исполнение договоров**

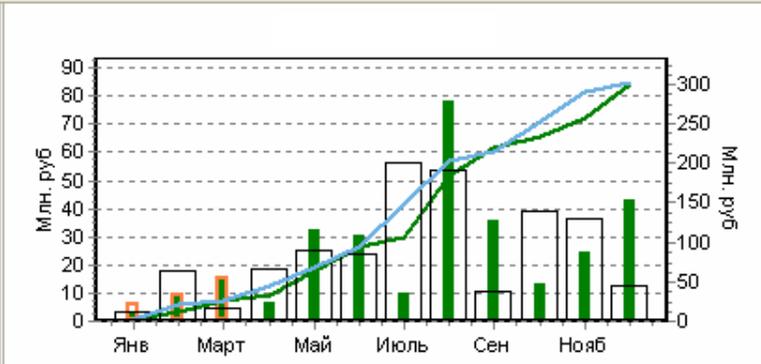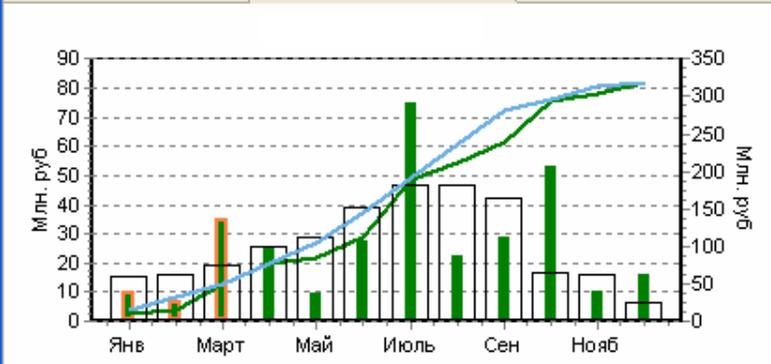

⚡ Пересчет плана

OK Отмена

🔍 Зкрыто



График финансирования

Платежный календарь

Учет и контроль

Взаиморасчеты


Договорное обеспечение

**Оперативное планирование**


Показатель	Стоимость объекта	Факт	%	Остаток	2 кв.	Апрель	Май	Июнь	3 кв.
					Местонахождение : Микрорайон №1				
Тип объекта : 1.Жилищное строительство									
Объект : Жилой комплекс № 1									
Выполнение	1142,7	50,4	4,4	1092,3	62,6	25,5	9,7	27,4	126,5
Финансирование	1142,7	5,8	0,5	1136,9	69,4	6,4	32,4	30,7	123,9
Объект : Жилой комплекс № 2									
Выполнение	1028,4	74,9	7,3	953,6	83,8	23,0	25,9	35,0	122,7
Финансирование	1028,4	0,0	0,0	1028,4	43,0	28,7	5,7	8,6	60,3
Объект : Жилой комплекс № 5									
Выполнение	1371,3	81,7	6,0	1289,6	111,7	30,6	34,5	46,7	163,6
Финансирование	1371,3	0,0	0,0	1371,3	57,4	38,3	7,7	11,5	80,4
Тип объекта : 2.Объекты инфраструктуры									

(1 кв. is greater than 0) Customize...

Плановые показатели | **Исполнение договоров**

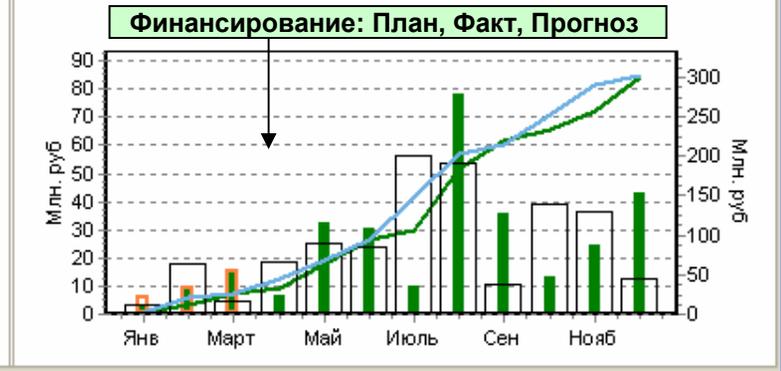

# Схема функционирования системы управления проектами

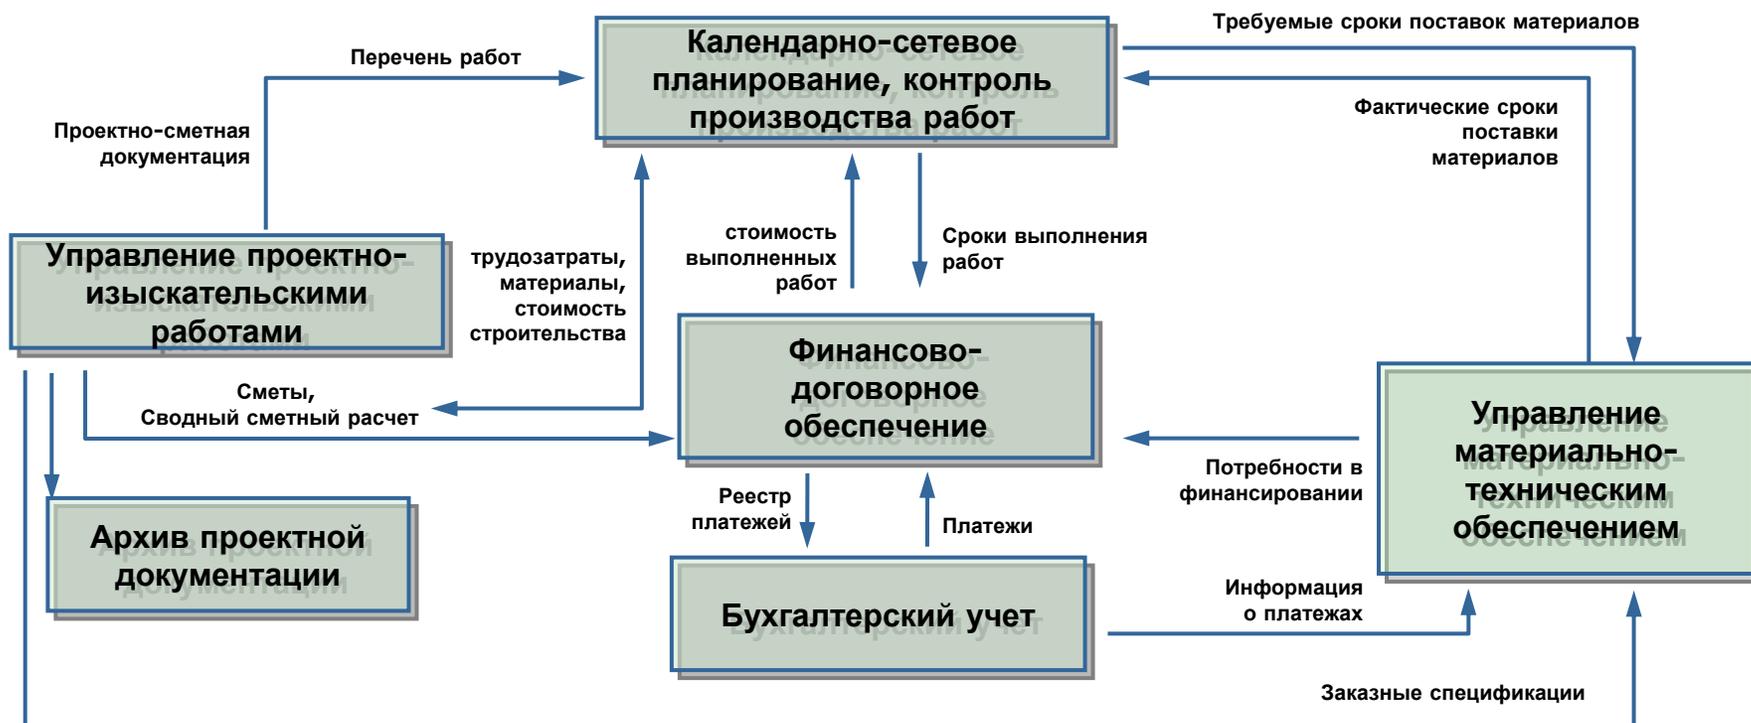

## Блок инвестиций и развития

# ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

18 сентября 2007

[ Выход ]

Графики

Фотоотчеты

Презентации

Инвестиционная программа

### Инвестиционные проекты ↓

Шатурская ГРЭС "Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400"

Сургутская ГРЭС-2 "Создание замещающей мощности на базе 2 x ПГУ-400"

Березовской ГРЭС "Завершение строительства 3 энергоблока на базе ПСУ-800"

Яйвинская ГРЭС "Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400"

### Проект "Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Шатурской ГРЭС" ↓

#### Ключевая информация о проекте

Срок реализации: 4 кв. 2009  
Стоимость проекта с НДС: 14 999 млн. руб.  
Место строительства: Шатура  
Вводимая мощность: 400Мвт  
Тип установки: ПГУ  
Основные документы по проекту

#### Основные участники проекта

Генподрядчик: Консорциум «General Electric International» и «Gama Guc Sistemleri Muhendislik Ve Taahut A.S.»  
Генпроектировщик: ОАО «Инженерный центр ЕЭС»-Институт «Теплоэлектропроект»  
Поставщик: «General Electric International»  
Технический агент: «stroenergo Group»

#### Графики реализации проекта

- Директивный
- Сводный (на дату: 01.09.2007) [Архив]
- Отчет о выполнении 90 дневного графика (3 кв. 2007, на дату: 01.09.2007) [Архив]

#### Фотоотчет о реализации проекта

- Вид строительной площадки
- Подготовительный период
  - Демонтажные работы (на дату: 01.09.2007) [Архив]
  - Перенос трубопроводов (на дату: 01.09.2007) [Архив]
  - Реконструкция ХВО (на дату: 01.09.2007) [Архив]

#### Отчетные материалы

- План комплексных мероприятий подготовительного периода
  - план
  - отчет о выполнении плана комплексных мероприятий (на дату: 01.09.2007) [Архив]
- Отчет о ходе реализации (на дату: 01.09.2007) [Архив]
- Отчет техногента

#### Погода на площадке строительства

##### Шатура

Вс, вечер +6...+8 °C 

Пн, ночь +5...+7 °C 

 GISMETEО.RU

Погода на неделю

# Схема функционирования системы управления проектами



- Project Planner Professional** – Подготовка и контроль исполнения календарно-сетевых графиков строительства, оптимизация распределения ресурсов
- PMControlling** – Контроль выполнения планов капитальных вложений, договорное обеспечение проектирования и строительства объектов
- PMLogistics** – Управление материально-техническим обеспечением строительства
- PMFinance** – Управление финансированием проектов капитального строительства

Опыт внедрения интегрированных IT-решений по управлению проектами капитального строительства:

---



Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства

---



Управление проектированием промышленных объектов

---



Интеграция системы управления проектами с управленческим и бухгалтерским учетом

---



Интеграция системы управления проектами с системами электронного документооборота

---



Интеграционные решения:  
SAP – PRIMAVERA, SAP – Сметное ПО

---

# Интеграционное решение PRIMAVERA - SAP








Project Planner/Scheduler




mySAP ERP (PS, MM, CO, FI, AM)

# Интеграционное решение SAP – Сметное ПО

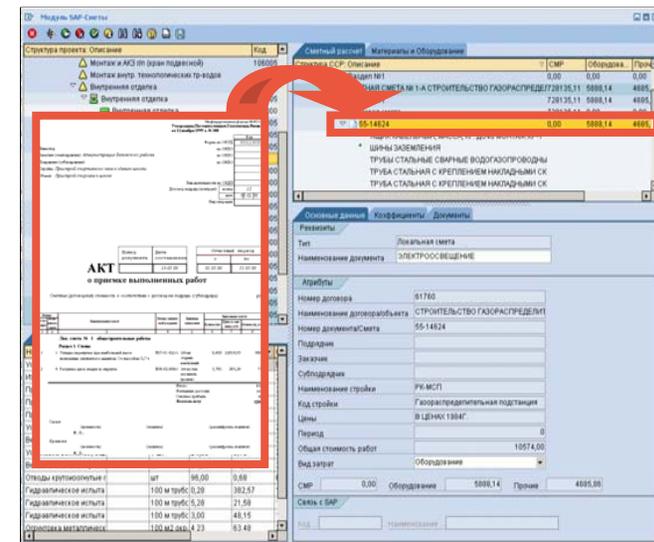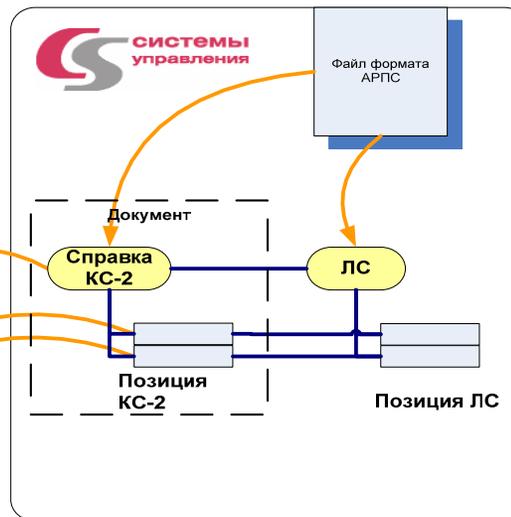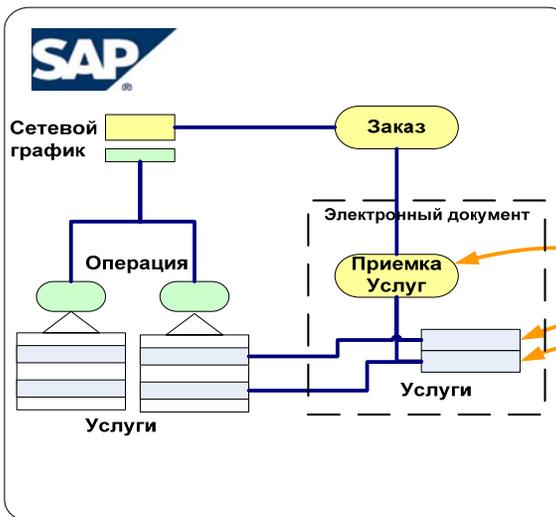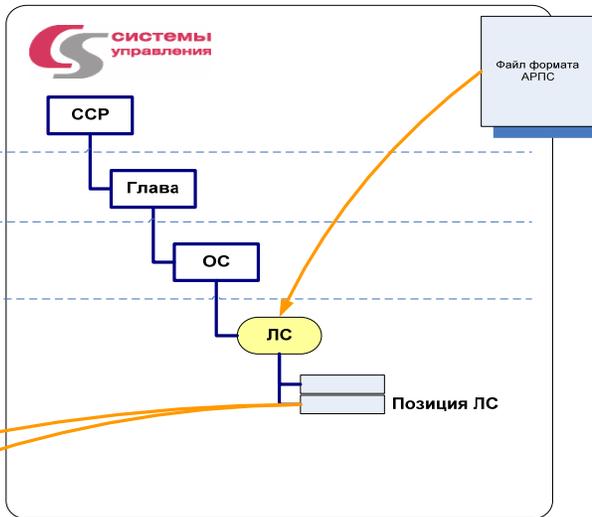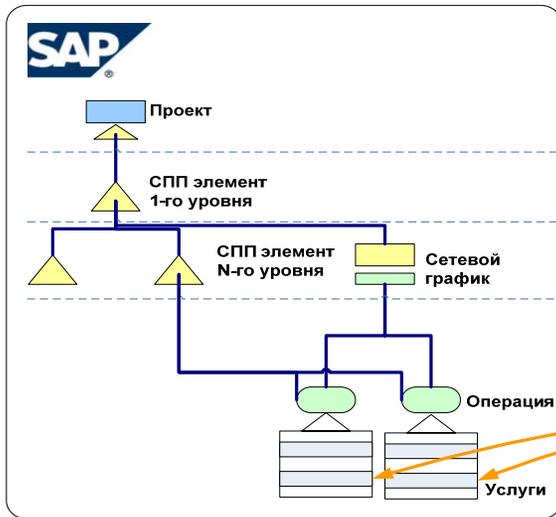

# Интеграционное решение PRIMAVERA – 1C – Directum

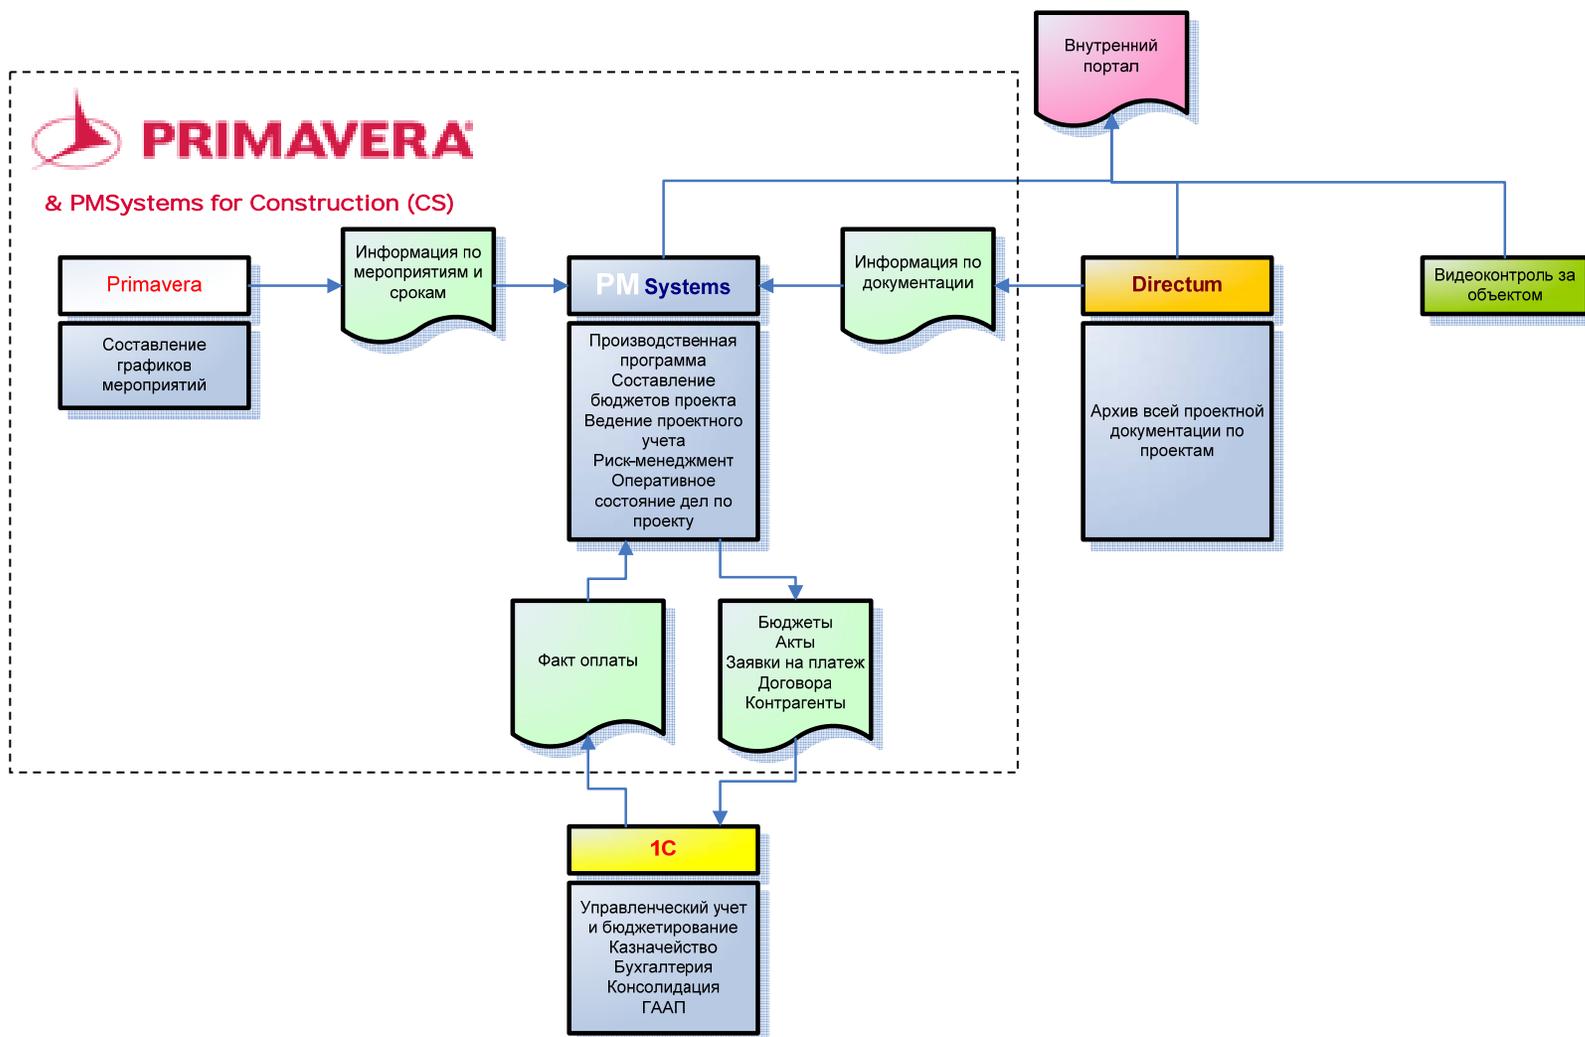

# Распределение функций основных участников проекта



# Методология управления проектами (нормативно-регламентные документы)



Информационная система управления проектами

# Общекорпоративные регламенты по управлению проектами



- Положение об организационной структуре управления проектом
  - Распределение полномочий между основными участниками проектов Компании (Исполнительный аппарат, дирекции по проектам, подрядчики)
  - Описание организационных взаимосвязей внутренних и внешних участников проектов
  - Положение о координационном комитете по управлению проектами
  - Положение о проектном офисе
  - Положение о руководителе проекта
  - Положения о функциональных подразделениях (в части проектно-ориентированной деятельности Компании)
  
- Регламент взаимодействия и распределения полномочий основных участников проекта
  - Процедура планирования проектов
  - Процедура контроля реализации проектов
  - Процедура управления изменениями в проектах
  - Процедура завершения проекта
  
- Регламент формирования подготовки и предоставления отчетности

# Внутренние регламенты по ЕРС/ЕРСМ-компаниям



## Регламент управления проектно-изыскательскими работами

- Регламент взаимодействия основных участников проектов в ходе подготовки, согласования, утверждения и выдачи проектно-сметной документации
- Регламент ведения архива проектной и нормативно-технической документации по проектам

## Регламент управления материально-техническим обеспечением строительства

- Регламент планирования поставок оборудования и материалов по проектам (взаимосвязь графиков комплектации и графиков выполнения ПИР, СМР)
- Регламент управления поставками МТР на объекты строительства, включая регламенты по транспортировке, складированию МТР и выдаче МТР в производство

## Регламент управления производством работ на объектах строительства

- Регламент планирования СМР по проектам капитального строительства
- Регламент контроля производства работ, включая оперативный ежесуточный /еженедельный контроль производства СМР на объектах и контроль выполнения СМР по формам КС-2, КС-3

## Регламент управления финансово-договорным обеспечением строительства

- Регламент планирования и контроля бюджета проекта
- Регламент подготовки, заключения и исполнения договоров по проектами строительства (по договорам с заказчиками и субподрядчиками)

## Регламент управления рисками проекта

## Регламент подготовки и проведения конкурсов на выполнение работ и поставку МТР

...

Опыт внедрения интегрированных IT-решений по управлению проектами капитального строительства:

---



Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства

---



Управление проектированием промышленных объектов

---



Интеграция системы управления проектами с управленческим и бухгалтерским учетом

---



Интеграция системы управления проектами с системами электронного документооборота

---



Интеграционные решения:  
SAP – PRIMAVERA, SAP – Сметное ПО

---

# Контакты

## Компания «Системы управления»

Россия, 115191, Москва, Гамсоновский пер. д.2

Тел.: +7 (495) 781-73-41

Web-site: [www.controlsystems.ru](http://www.controlsystems.ru)

E-mail: [contact@controlsystems.ru](mailto:contact@controlsystems.ru)
